경영회의 보고서

(2012년 01월)

2012.01.10

경영지원팀

목차

1. 전월지시사항

2. 공장전체 매출/부가가치/인원 현황

2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획

2-2. Chassis부문 운영 현황

1) 제품군별 매출 및 부가가치 현황

2) 라인 및 인력운영 현황

3) 생산성 현황

2-3. Seat 운영 현황

1) 제품군별 매출 및 부가가치 현황

2) 라인 및 인력운영 현황

3) 생산성 현황

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-1. 투자비 현황

3-2. 해외법인 선투자비 현황

3-3. 신규 Project 진행 현황

4. TCR2011 원가절감 현황

5. 2011년 고객사 차량할당 실적 현황


6. 사업본부별 중점 추진 업무(동향자료)


7. 사장님 말씀

1. 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	지정부서	일정	추진실적 및 현황	추진부서	일정	진도	비고
사업계획	1.2012년 사업계획 준비 철저 1)경제상황 악화시 대비책 강구							
기타	경영회의 보고양식 변경	경영지원팀		차월부터 수정/보고				

2. 매출 / 부가가치 / 인원현황

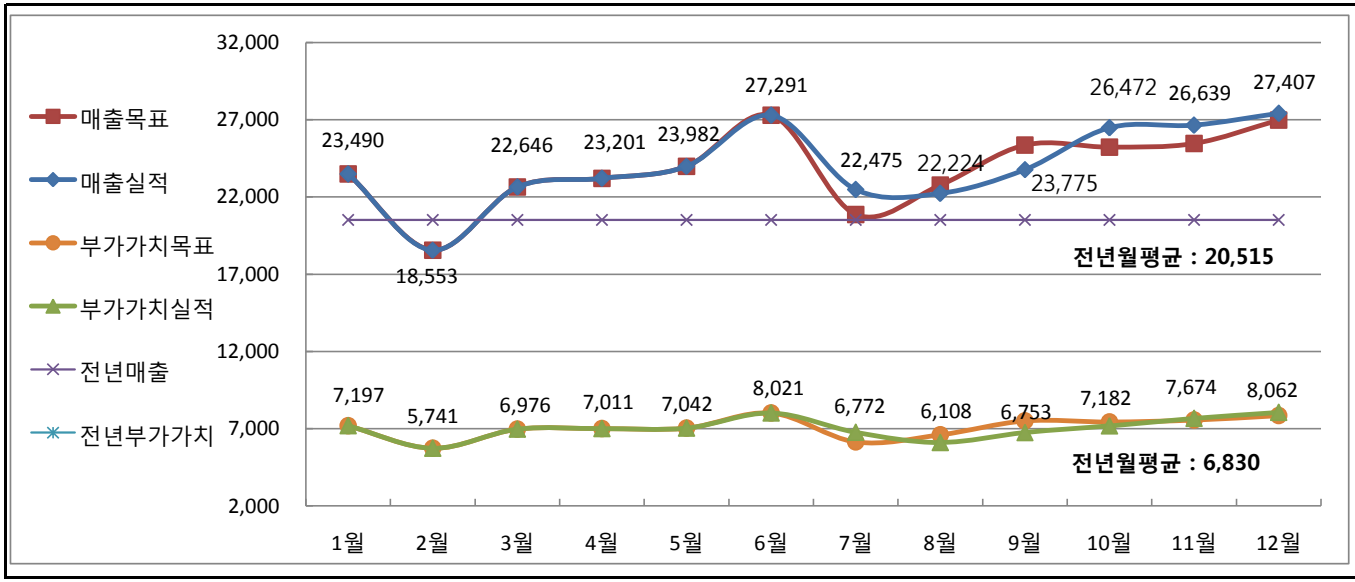

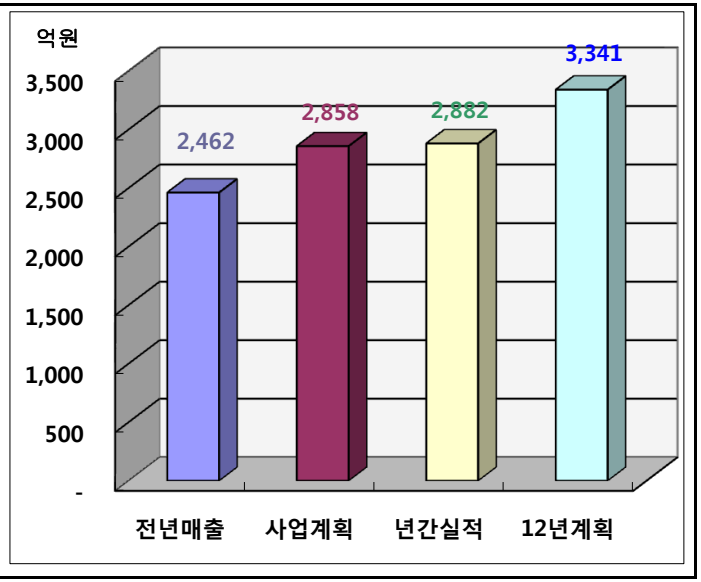

구분		전년평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	**합계**	12년01월
매출 (백만원)	목표	19,705	23,490	18,553	22,646	23,201	23,982	27,291	20,864	22,768	25,359	25,224	25,462	26,977	**285,818**	25,907
	실적	20,515	23,490	18,553	22,646	23,201	23,982	27,291	22,475	22,224	23,775	26,472	26,639	27,407	**288,155**	(23,135)
	%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108%	98%	94%	105%	105%	102%	**101%**	89%
부가 가치 (백만원)	목표	6,572	7,197	5,741	6,976	7,011	7,042	8,021	6,148	6,608	7,509	7,440	7,565	7,854	**85,112**	7,115
	실적	6,830	7,197	5,741	6,976	7,011	7,042	8,021	6,772	6,108	6,753	7,182	7,674	8,062	**84,539**	(6,677)
	%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110%	92%	90%	97%	101%	103%	**99%**	94%
인원 현황 (명)	목표	500	509	509	509	509	515	524	532	536	536	536	536	536	**524**	561
	실적	494	509	509	509	509	515	524	532	531	531	532	540	541	**523**	
	%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%	99%	99%	**100%**	
인당 매출액 (백만원/명)	목표	39.4	46.1	36.4	44.5	45.6	46.6	52.1	39.2	42.5	47.3	47.1	47.5	50.3	**545.2**	46.2
	실적	41.5	46.1	36.4	44.5	45.6	46.6	52.1	42.2	41.9	44.8	49.8	49.3	50.7	**550.0**	
	%	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108%	99%	95%	106%	104%	101%	**101%**	
인당 부가가치 (백만원/명)	목표	13.1	14.1	11.3	13.7	13.8	13.7	15.3	11.6	12.3	14.0	13.9	14.1	14.7	**162.4**	12.7
	실적	13.8	14.1	11.3	13.7	13.8	13.7	15.3	12.7	11.5	12.7	13.5	14.2	14.9	**161.4**	
	%	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110%	93%	91%	97%	101%	102%	**99%**	


2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획


고객사		12월 실적				12년 01월 계획								12년 02월 전망			
		가동일	차량(대)		Total	가동일		차량(대)				Total		가동일	차량(대)		Total
								OEM		KD							
			OEM	KD			전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비		OEM	KD	
부평#1	T250	21	8,436	10,864	**19,300**	15	71%	-	0%	15,836	146%	**15,836**	82%	21	-	11,957	**11,957**
	T300		5,084	-	**5,084**			12,800	252%	-	-	**12,800**			13,670	-	**13,670**
부평#2	V250	23	1,352	-	**1,352**	19	83%	1,905	141%	-	-	**1,905**	141%	23	-	-	**-**
	VS/V300		1,468	-	**1,468**			969	66%	-	-	**969**	66%		2,914	-	**2,914**
	C140		8,658	2,560	**11,218**			7,246	84%	1,188	46%	**8,434**	75%		12,186	992	**13,178**
군산	J200	22	5,699	5,016	**10,715**	19	86%	4,420	78%	4,829	96%	**9,249**	86%	21	6,243	4,886	**11,129**
	J300		16,509	19,548	**36,057**			14,830	90%	15,364	79%	**30,194**	84%		21,287	18,116	**39,403**
HMC	BH	27	4,787	-	**4,787**	21	78%	3,650	76%	-		**3,650**	76%	25	5,100	-	**5,100**
	VI	27	1,506	-	**1,506**	21	78%	1,100	73%	-		**1,100**	73%	25	2,000	-	**2,000**
KMC	UN	24	3,119	-	**3,119**	20	83%	2,600	83%	-		**2,600**	83%	23	3,000	-	**3,000**

Note>

2-2. 샤시부문 운영 현황

2-2-1. 매출 및 부가가치 현황

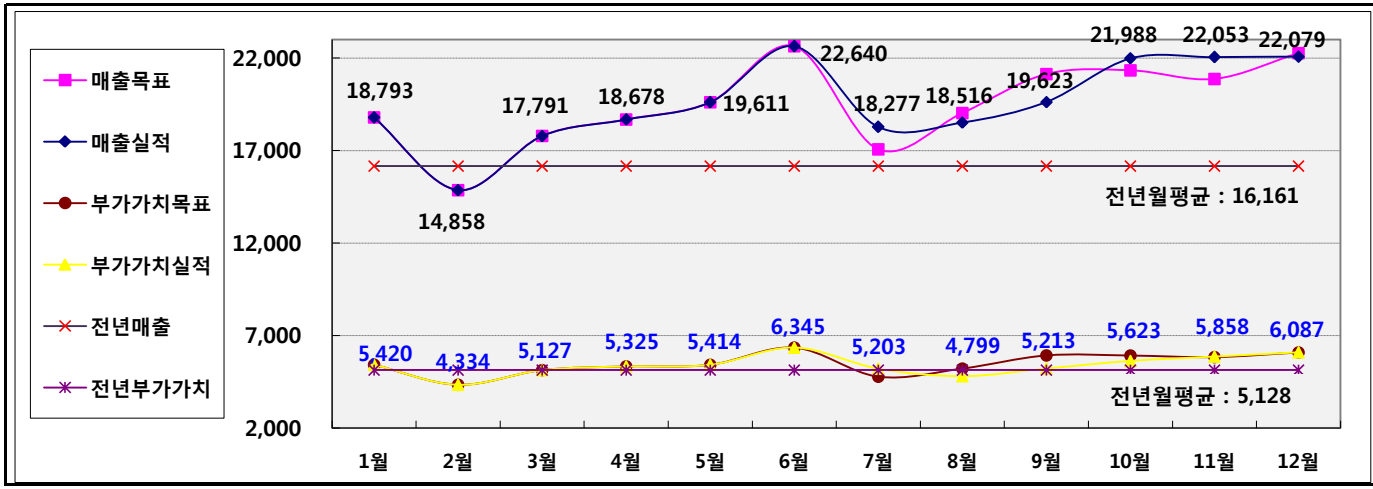

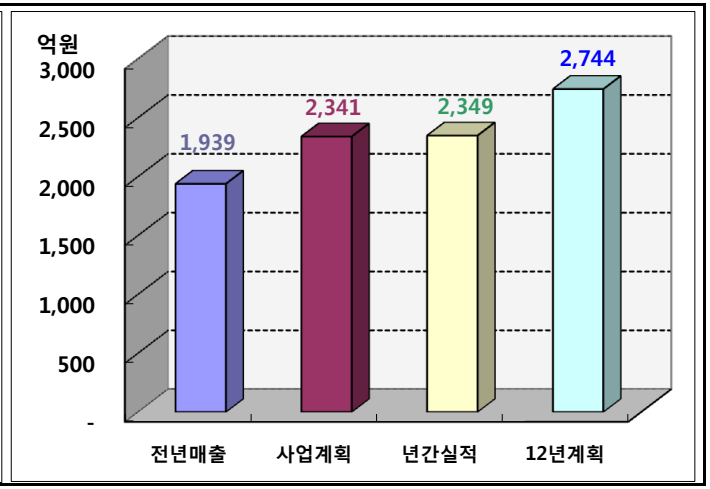

구분			2010년 월평균	2011년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	2012년 01월
매출	Wheel	계획	2,583	3,297	2,211	2,522	3,172	3,158	3,875	2,407	2,789	2,895	3,019	2,462	2,671	**34,477**	2,977
		실적	2,708	3,297	2,211	2,522	3,172	3,158	3,875	3,163	2,916	3,347	3,447	3,110	3,575	**37,792**	(2,540)
	Chassis	계획	12,421	15,140	12,335	14,920	15,034	16,019	18,243	14,227	15,818	17,776	17,901	17,887	19,064	**194,365**	18,341
		실적	13,065	15,140	12,335	14,920	15,034	16,019	18,243	14,707	15,218	15,845	18,076	18,491	18,044	**192,072**	(16,238)
	Module	계획	377	357	312	348	472	435	522	431	419	462	414	520	532	**5,224**	402
		실적	388	357	312	348	472	435	522	407	383	431	464	452	459	**5,042**	(368)
샤시사업본부Total		**계획**	**15,381**	**18,793**	**14,858**	**17,791**	**18,678**	**19,611**	**22,640**	**17,065**	**19,027**	**21,133**	**21,335**	**20,870**	**22,266**	**234,066**	**21,720**
		실적	**16,161**	**18,793**	**14,858**	**17,791**	**18,678**	**19,611**	**22,640**	**18,277**	**18,516**	**19,623**	**21,988**	**22,053**	**22,079**	**234,906**	**(19,146)**
		%	**105%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**107%**	**97%**	**93%**	**103%**	**106%**	**99%**	**100%**	**88%**
부가가치	Wheel	계획	819	920	604	705	884	903	1,119	710	839	860	909	734	810	**9,998**	841
		실적	865	920	604	705	884	903	1,119	971	895	1,009	990	834	1,014	**10,848**	(720)
	Chassis	계획	3,692	4,143	3,418	4,074	3,969	4,076	4,703	3,630	3,951	4,600	4,592	4,576	4,739	**50,470**	4,389
		실적	3,875	4,143	3,418	4,074	3,969	4,076	4,703	3,825	3,522	3,772	4,168	4,572	4,614	**48,856**	(4,152)
	Module	계획	377	357	312	348	472	435	522	431	419	462	414	520	532	**5,224**	402
		실적	388	357	312	348	472	435	522	407	383	431	464	452	459	**5,043**	(368)
샤시사업본부Total		**계획**	**4,888**	**5,419**	**4,334**	**5,127**	**5,325**	**5,413**	**6,345**	**4,772**	**5,209**	**5,922**	**5,916**	**5,830**	**6,081**	**65,692**	**5,632**
		실적	**5,128**	**5,420**	**4,334**	**5,127**	**5,325**	**5,414**	**6,345**	**5,203**	**4,799**	**5,213**	**5,623**	**5,858**	**6,087**	**64,746**	**(5,240)**
		%	**105%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**109%**	**92%**	**88%**	**95%**	**100%**	**100%**	**99%**	**93%**


2-2. 샤시부문 운영 현황

2-2-2. 라인 및 인력 운영 현황

라인별		12월 실적 인원	12년 01월 계획					12년 02월 전망			비 고 (충원 및 인력 운영 계획)
			인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	인원	Shift	조업일수	
				인원	증감율						
Wheel	Disc	58	58	0	0%	2Shift	20	58	2Shift	23	* 금형인원 포함
	Rim Ass'y#1					1Shift	20		1Shift	23	
	Rim Ass'y#2					1.5Shift	20		1.5Shift	23	
	ED					1.5Shift	20		1.5Shift	23	
Longi / Stamping		59	59	0	0%	2Shift	21	59	2Shift	23	
C/MBR	T200	93	93	0	0%	2Shift	20	93	2Shift	23	* Axle 기준
	J200					1Shift	20		1Shift	23	
	J300					2Shift	23		2Shift	25	
	C100					1.5Shift	23		1.5Shift	25	
C/ARM		20	20	0	0%	1 or 2Shift	22	20	1 or	25	
E/D		18	18	0	0%	2Shift	22	18	2Shift	25	
직접 소계		**248**	**248**	**0**	**0%**			**248**			
	품질	33	33	0	0%			33			
	물류	31	31	0	0%			31			* 전의공장 인원 포함
	보전	17	17	0	0%			17			* 전의공장 인원 포함
간접 소계		**81**	**81**	**0**	**0%**			**81**			
합계		**329**	**329**	**0**	**0%**			**329**			

2-2. 샤시부문 운영 현황


2-2-3. 생산성 현황-Wheel

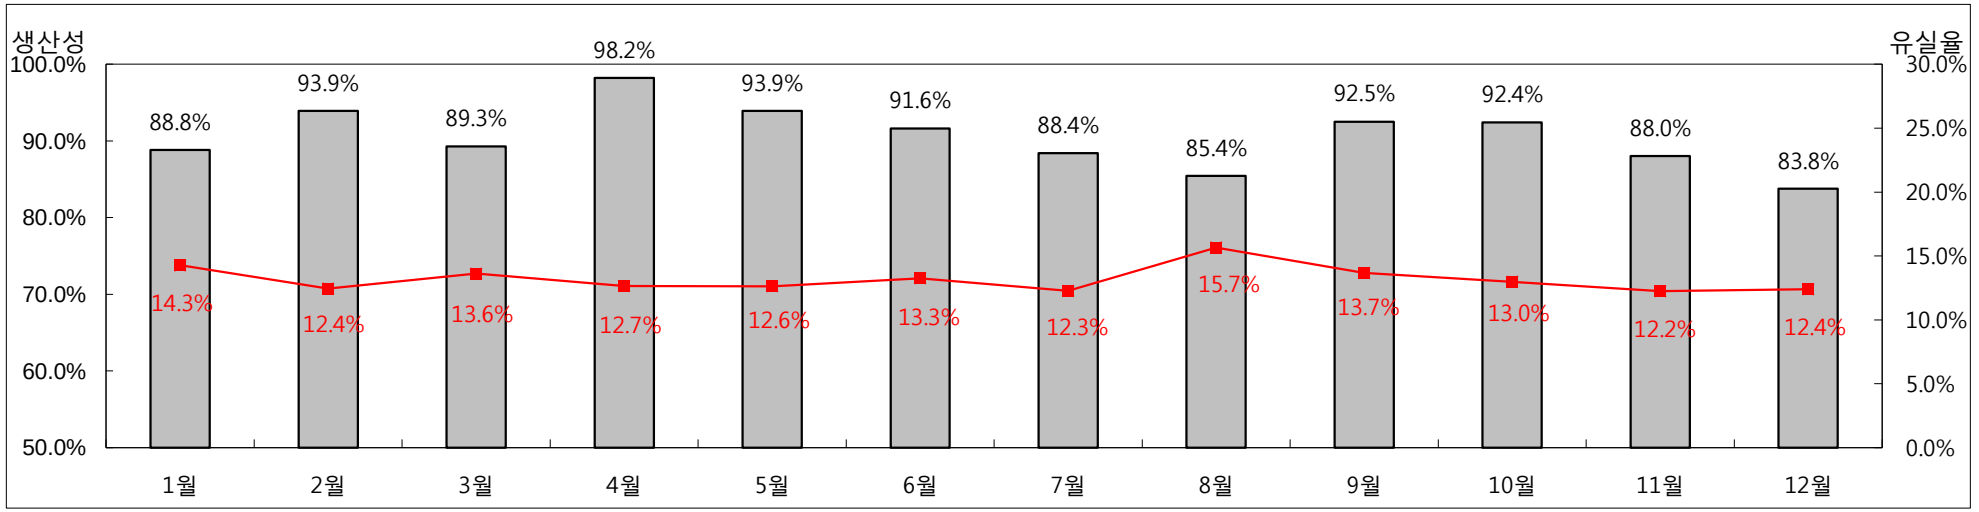

구분	CY2011												TOTAL
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
투입공수	11,879	9,008	9,886	10,039	10,204	12,672	11,302	10,674	11,036	11,708	10,643	11,745	
유실공수	1,695	1,121	1,346	1,270	1,289	1,680	1,386	1,671	1,508	1,520	1,303	1,456	
작업공수	10,184	7,887	8,539	8,768	8,915	10,992	9,916	9,003	9,528	10,188	9,340	10,289	
표준공수	10,552	8,459	8,829	9,862	9,584	11,610	9,993	9,121	10,211	10,820	9,370	9,837	
생산성(%)	88.8%	93.9%	89.3%	98.2%	93.9%	91.6%	88.4%	85.4%	92.5%	92.4%	88.0%	83.8%	
성과율(%)	103.6%	107.3%	103.4%	112.5%	107.5%	105.6%	100.8%	101.3%	107.2%	106.2%	100.3%	95.6%	
유실율(%)	14.3%	12.4%	13.6%	12.7%	12.6%	13.3%	12.3%	15.7%	13.7%	13.0%	12.2%	12.4%	
유실금액(백만원)	31	20	24	23	23	30	25	30	27	27	23	26	
인당 OT	**4.4**	**4.6**	**2.1**	**2.9**	**2.9**	**4.3**	**3.9**	**4.2**	**4.3**	**5.3**	**2.9**	**3.5**	
주 유실원인	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 품질조정	공정대기 금형교환 설비고장	공정대기 금형교환 설비고장	금형교환 공정대기 설비고장	

2-2. 샤시부문 운영 현황


2-2-3. 생산성 현황-Chassis

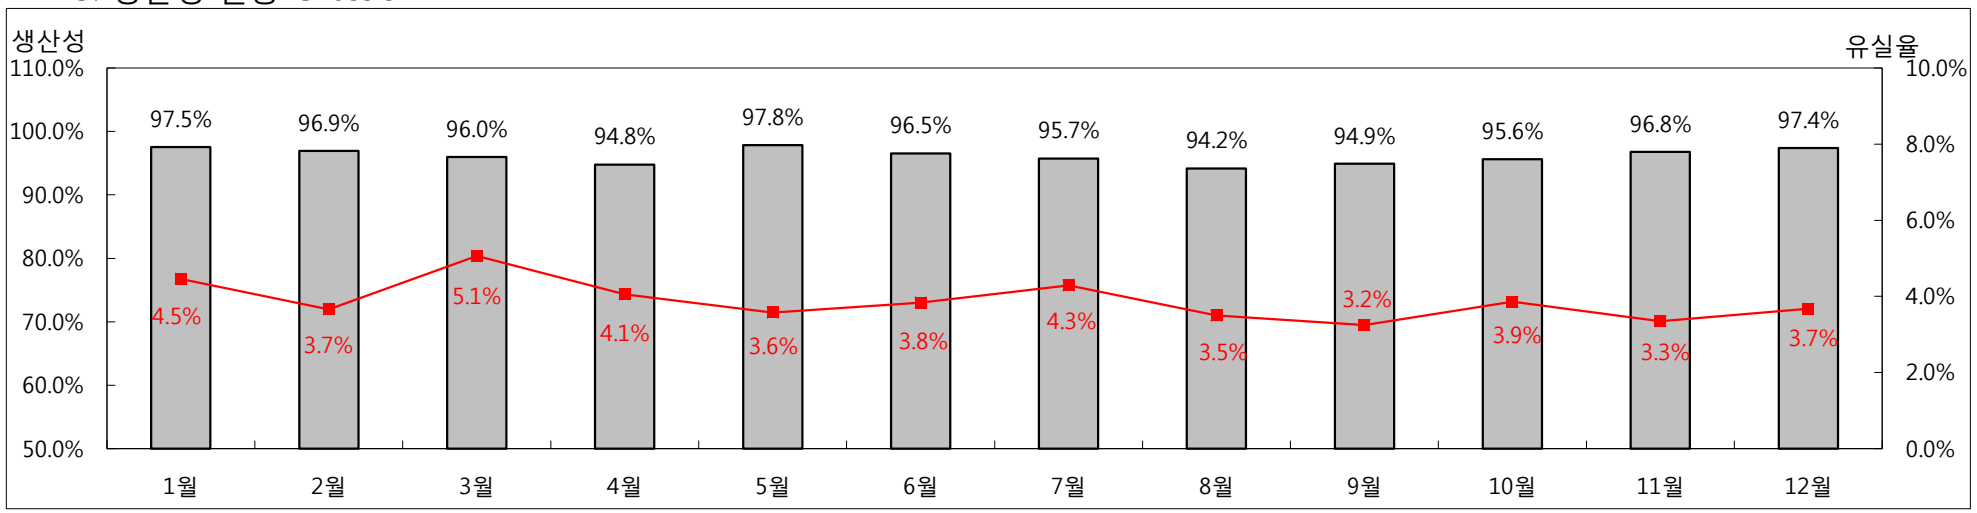


구분	CY2011												TOTAL
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
투입공수	24,251	20,542	26,010	25,193	24,391	28,627	23,729	22,614	22,873	27,657	27,090	26,035	
유실공수	1,082	752	1,316	1,022	873	1,098	1,019	791	743	1,067	907	958	
작업공수	23,168	19,790	24,696	24,171	23,518	27,529	22,710	21,822	22,130	26,590	26,183	25,077	
표준공수	23,654	19,911	24,962	23,873	23,859	27,625	22,713	21,296	21,708	26,438	26,211	25,357	
생산성(%)	97.5%	96.9%	96.0%	94.8%	97.8%	96.5%	95.7%	94.2%	94.9%	95.6%	96.8%	97.4%	
성과율(%)	102.1%	100.6%	101.1%	98.8%	101.4%	100.3%	100.0%	97.6%	98.1%	99.4%	100.1%	101.1%	
유실율(%)	4.5%	3.7%	5.1%	4.1%	3.6%	3.8%	4.3%	3.5%	3.2%	3.9%	3.3%	3.7%	
유실금액(백만원)	19	14	24	18	16	20	18	14	13	19	16	17	
인당 OT	**3.3**	**3.5**	**2.9**	**3.0**	**3.1**	**3.9**	**3.2**	**3.5**	**3.2**	**4.7**	**3.1**	**2.8**	
주 유실원인	**자재결품** 설비이상 설비고장	**자재결품** 설비이상 설비고장	**자재결품** 설비이상 소모품교체	**자재결품** 설비이상 소모품교체	**자재결품** 설비이상 소모품교체	**자재결품** 설비이상 소모품교체	**자재결품** 설비이상 소모품교체	**자재결품** 설비이상 소모품교체	**자재결품** 설비이상 소모품교체	**품질조정** 설비이상 소모품교체	설비이상 소모품교체 설비고장	설비이상 소모품교체 설비고장	

2-3. 시트부문 운영 현황

2-3-1. 매출 및 부가가치 현황

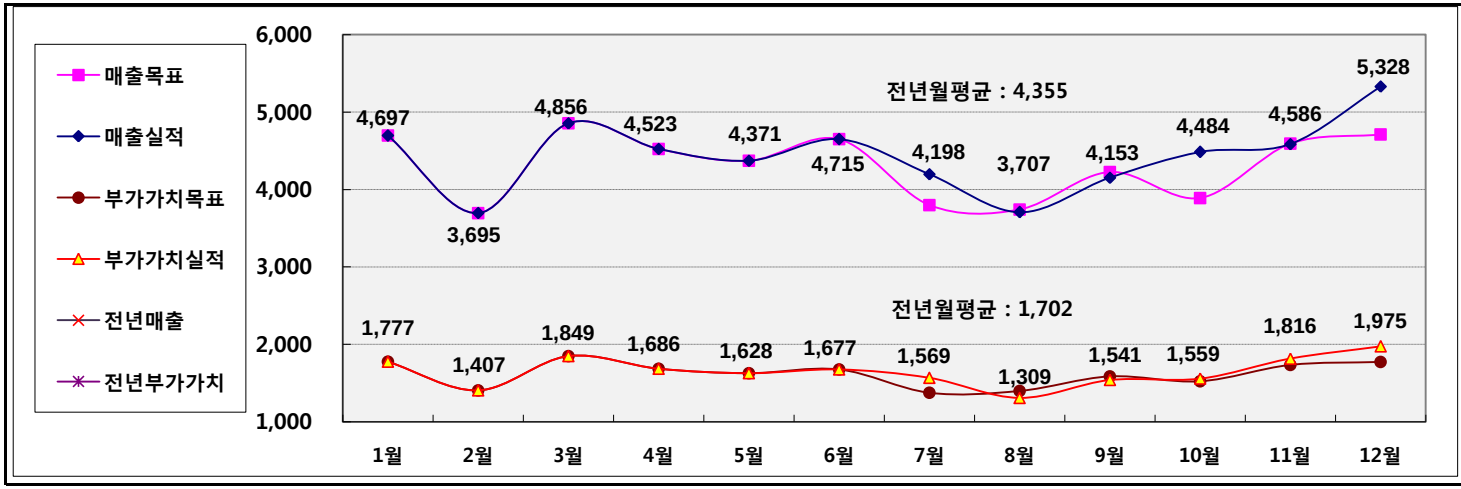

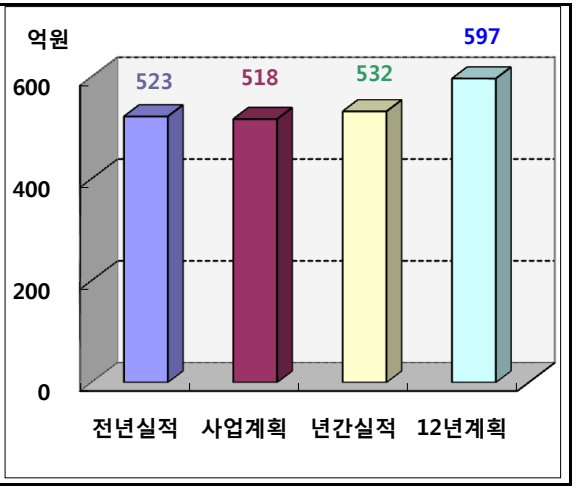

구분			2010년 월평균	2011년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	2012년 01월
매출	Seat	계획	4,324	4,697	3,695	4,856	4,523	4,371	4,651	3,799	3,741	4,226	3,889	4,593	4,711	**51,752**	4,187
		실적	4,355	4,697	3,695	4,856	4,523	4,371	4,651	4,198	3,707	4,153	4,484	4,586	5,328	**53,249**	(3,989)
		계획	**4,324**	**4,697**	**3,695**	**4,856**	**4,523**	**4,371**	**4,651**	**3,799**	**3,741**	**4,226**	**3,889**	**4,593**	**4,711**	**51,752**	**4,187**
사업본부 Total		**실적**	**4,355**	**4,697**	**3,695**	**4,856**	**4,523**	**4,371**	**4,651**	**4,198**	**3,707**	**4,153**	**4,484**	**4,586**	**5,328**	**53,249**	**(3,989)**
		%	**101%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**111%**	**99%**	**98%**	**115%**	**100%**	**113%**	**103%**	**95%**

부가 가치	Seat	계획	1,683	1,777	1,407	1,849	1,686	1,628	1,677	1,376	1,399	1,587	1,524	1,735	1,774	**19,420**	1,483
		실적	1,702	1,777	1,407	1,849	1,686	1,628	1,677	1,569	1,309	1,541	1,559	1,816	1,975	**19,792**	(1,437)
		계획	**1,683**	**1,777**	**1,407**	**1,849**	**1,686**	**1,628**	**1,677**	**1,376**	**1,399**	**1,587**	**1,524**	**1,735**	**1,774**	**19,420**	**1,483**
사업본부 Total		**실적**	**1,702**	**1,777**	**1,407**	**1,849**	**1,686**	**1,628**	**1,677**	**1,569**	**1,309**	**1,541**	**1,559**	**1,816**	**1,975**	**19,792**	**(1,437)**
		%	**101%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**114%**	**94%**	**97%**	**102%**	**105%**	**111%**	**102%**	**97%**


2-3. 시트부문 운영 현황

2-3-2. 라인 및 인력 운영 현황

라인별		12월 실적 인원	12년 01월 계획						12년 02월 전망				비 고 (충원 및 인력 운영 계획)
			인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	O/T	인원	Shift	조업일수	O/T	
				인원	증감율								
전의공장	TRACK ASS'Y					1 or 2Shift	22	3T		1 or 2Shift	23	3T	YN TRACK 2Shift
	RECLINER ASS'Y	71	74	3	4%	1 or 2Shift	22	3T	74	1 or 2Shift	23	3T	ROUND RECLINER 2Shift
	SUB ASS'Y(용접)					1 or 2Shift	22	3T		1 or 2Shift	23	3T	T-5 용접 2Shift
	STAMPING	10	10	0	0%	1Shift	22	3T	10	1Shift	25	3T	
	E/D	7	7	0	0%	1Shift	22	3T	7	1Shift	25	3T	
	소계	88	91	3	3%				91				
전의공장	KH	0	0	0					0				KH 양산관련 인원 충원예정
양산공장	BH/VI	29	28	-1	-3%	1Shift	21	2T	28	1Shift	25	2T	
군산공장	J-200/UN/A-100	22	23	1	5%	1Shift	19		23	1Shift	21	2T	
인천공장	C-100	28	28	0	0%	2Shift	19	2T	28	2Shift	25	2T	
직접 소계		**167**	**170**	**3**	**2%**				**170**				전월대비 4명 증가(전의 2, 군산2)
간접	생산	2	2	0	0%				4				전의 2, 용접라인 오퍼레이터 충원예정 2
	품질	9	9	0	0%				9				전의 5, 군산 2, 인천 1, KH 1
	물류	9	9	0	0%				9				전의 4, 군산 1, 양산 2, 인천 1, KH 1
	시작실	1	1	0	0%				1				
	금형	0	0	0	0%				2				F/B 관련 인원 충원예정 2
	보전	1	1	0	0%				1				
간접 소계		**22**	**22**	**0**	**0%**				**26**				전월대비 1명 증가(KH 물류)
합계		**189**	**192**	**3**	**2%**				**196**				* 8월 179명 / 9월 178명 / 10월 182명 / 11월 184명

2-3. 시트부문 운영 현황


2-3-3. 생산성 현황

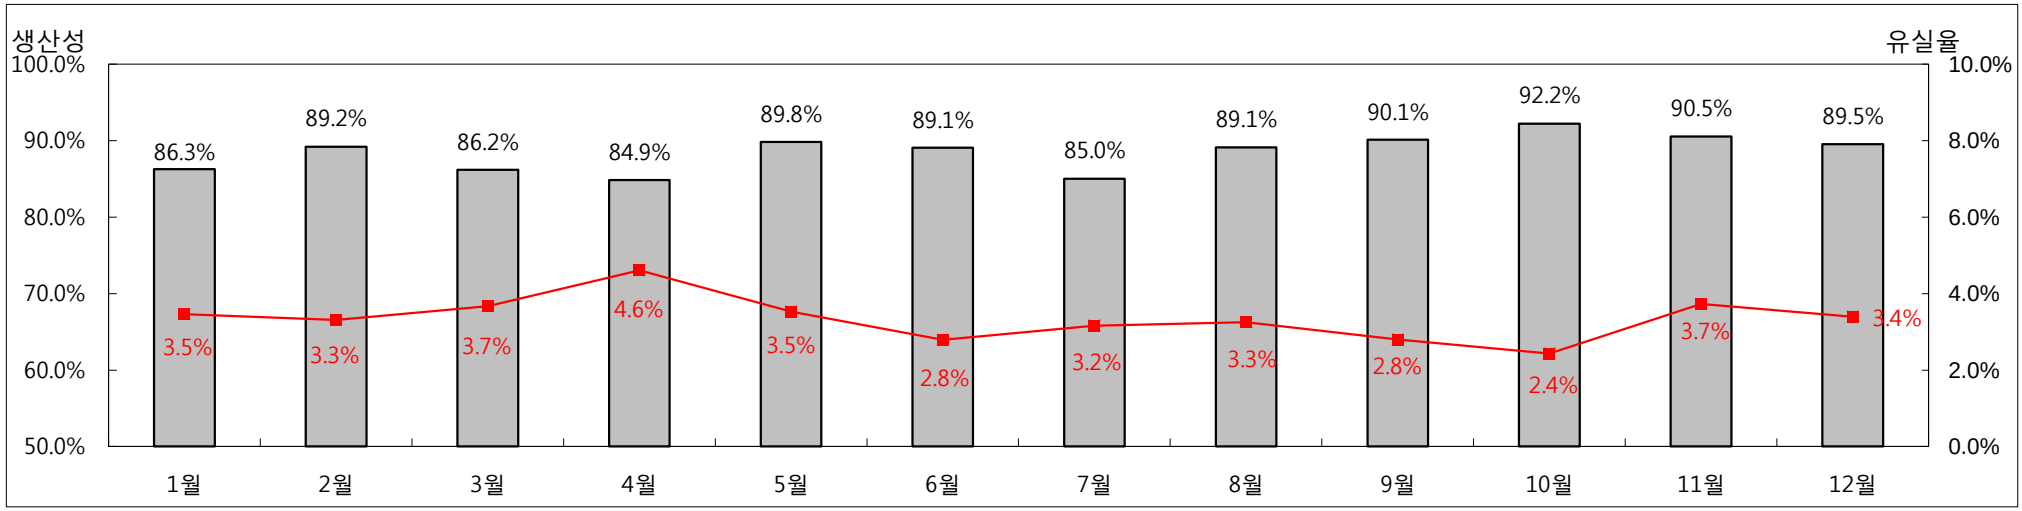


구분	CY2010 실적	CY2011												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	328,871	36,089	29,806	39,336	35,844	34,146	34,129	34,157	28,613	31,742	34,111	34,177	36,160	408,310
유실공수	11,205	1,249	988	1,443	1,653	1,206	953	1,080	931	889	830	1,274	1,229	13,724
작업공수	317,666	34,840	28,818	37,893	34,191	32,940	33,176	33,077	27,683	30,854	33,281	32,902	34,931	394,586
표준공수	289,271	31,130	26,592	33,907	30,416	30,679	30,398	29,044	25,497	28,608	31,461	30,943	32,376	361,051
생산성(%)	88.0%	86.3%	89.2%	86.2%	84.9%	89.8%	89.1%	85.0%	89.1%	90.1%	92.2%	90.5%	89.5%	88.4%
성과율(%)	91.1%	89.4%	92.3%	89.5%	89.0%	93.1%	91.6%	87.8%	92.1%	92.7%	94.5%	94.0%	92.7%	91.5%
유실율(%)	3.4%	3.5%	3.3%	3.7%	4.6%	3.5%	2.8%	3.2%	3.3%	2.8%	2.4%	3.7%	3.4%	3.4%
유실금액(백만원)	202	22	18	26	30	22	17	19	17	16	15	23	22	247
인당 OT	**3.1**	**2.8**	**3.3**	**3.2**	**3.1**	**3.4**	**2.9**	**2.8**	**2.9**	**3.0**	**3.4**	**2.3**	**3.2**	**3.0**
주 유실원인	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *품질조정	*자재결품 *정전 *설비이상 *금형교환	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *REPAIR	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *코일장착	*자재결품 (내제포함) *REPAIR *설비고장 *금형교환	*자재결품 (내제포함) *설비이상 *금형교환 *REPAIR	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *REPAIR	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *REPAIR	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *REPAIR	*자재결품 *금형교환 *설비이상 *REPAIR	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *REPAIR	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *품질조정	*자재결품 *설비이상 *금형교환 *REPAIR	

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-1.투자비 현황(발주기준,프로젝트별)

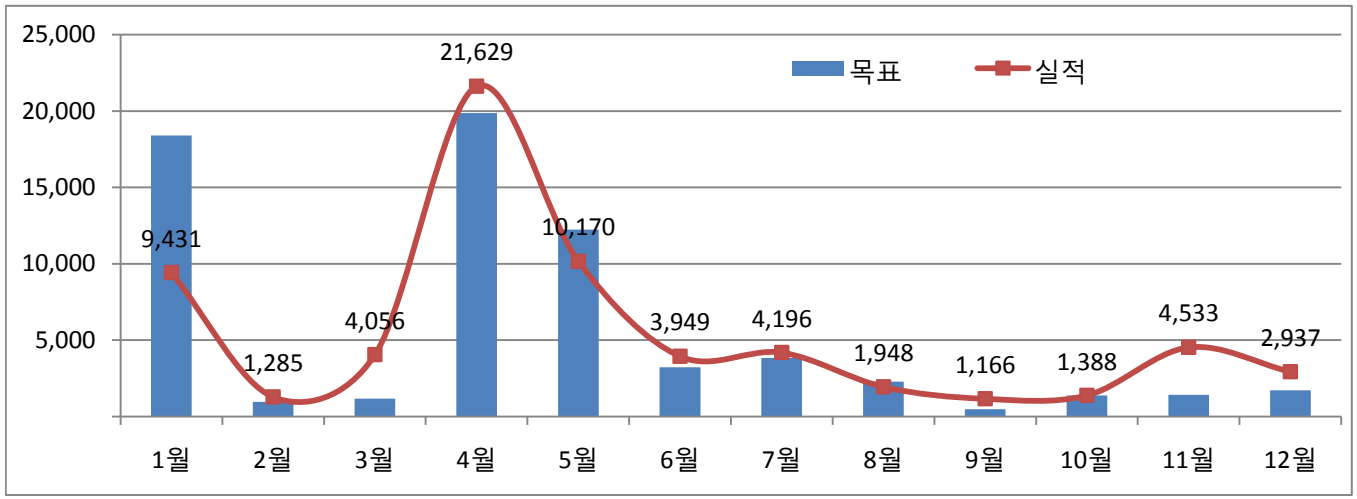

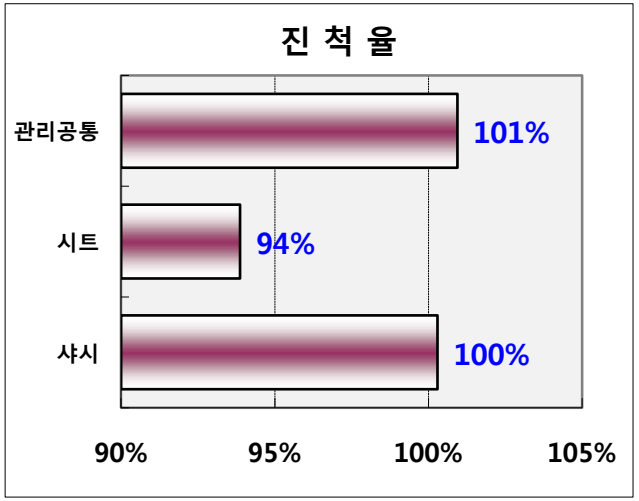

1.프로젝트별 계획/실적 단위:백만원


구분		전년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
샤시	목표	6,157	17,881	135	591	1,631	540	2,655	638	473	373	235	50		**25,203**
	실적	8,630	9,147	172	3,623	3,307	553	1,870	994	653	1,145	434	1,789	1,589	**25,277**
시트	목표	4,387	317	741	444	205	107	527	3,147	788	11	1,059	1,305	1,716	**10,368**
	실적	3,943	200	1,016	421	260	24	20	3,149	1,287	12	63	1,990	1,291	**9,732**
관리공통	목표	501	212	85	135	18,027	11,588	47	47	1,020	85	80	60		**31,385**
	실적	887	84	97	11	18,063	9,593	2,059	53	8	9	891	754	57	**31,680**
합계	목표	11,044	18,411	961	1,170	19,863	12,235	3,229	3,833	2,281	469	1,374	1,415	1,716	**66,956**
	실적	13,461	9,431	1,285	4,056	21,629	10,170	3,949	4,196	1,948	1,166	1,388	4,533	2,937	**66,689**
	%	122%	51%	134%	347%	109%	83%	122%	109%	85%	249%	101%	320%	171%	**100%**


특기사항

1. 관리공통: 12월 실적 57백만원(ADOBE S/W구매 외)

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-1.투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-샤시

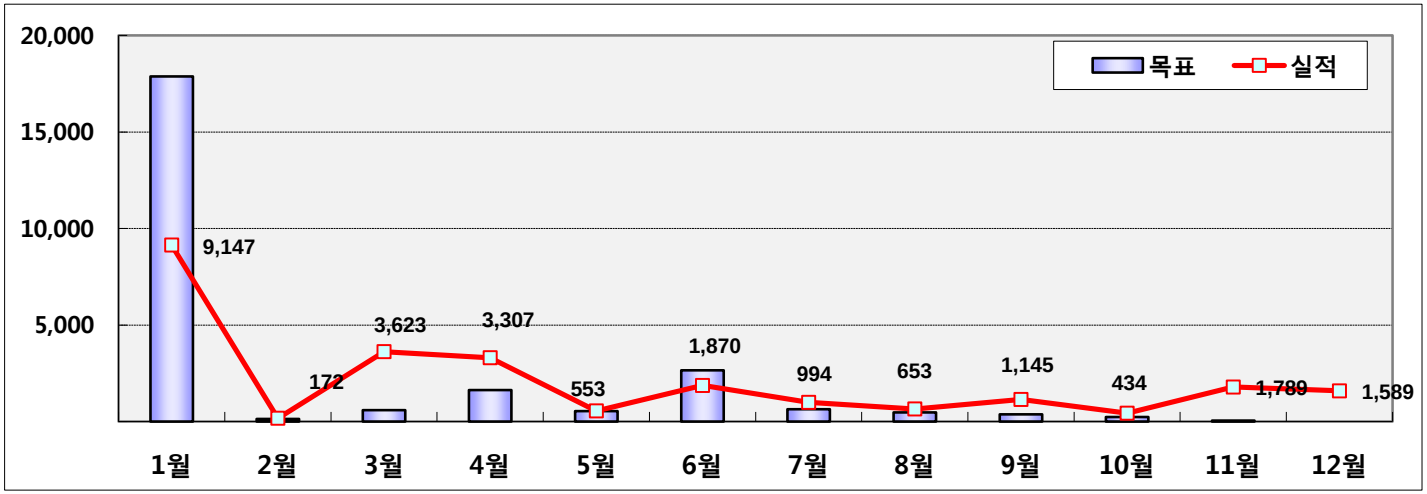

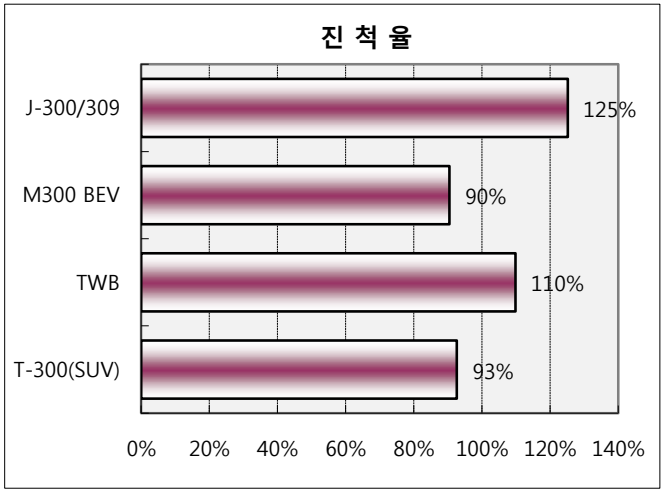

1.프로젝트별 계획/실적 단위:백만원

구분		전년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
T-300(SUV)	목표	2,263	8,595	37	244	176	223	95	92	74	88	5			9,629
	실적	4,308	1,179	152	3,416	2,199	335	202	545	73	73	24	581	141	8,920
TWB	목표		4,400		50	70	23	400							4,943
	실적		4,400					400		3	586		33	9	5,431
M300 BEV	목표		4,618		45	275	25	341		180	175	230			5,889
	실적		3,401		45		25		22	79	66	137	903	650	5,328
J-300/309	목표		18		146	984	90	857	100	50	70		50		2,365
	실적		18		131	984		836	213	291			170	319	2,961
샤시기타	목표	3,893	250	98	105	126	179	962	446	169	40				2,376
	실적	4,322	149	20	31	124	193	432	215	208	421	273	102	470	2,637
합계	목표	6,157	17,881	135	591	1,631	540	2,655	638	473	373	235	50		25,203
	실적	8,630	9,147	172	3,623	3,307	553	1,870	994	653	1,145	434	1,789	1,589	25,277
	%	140%	51%	128%	613%	203%	102%	70%	156%	138%	307%	185%	3578%	0%	100%

특기사항

1. 2012년 이월 투자비 : 930백만원


1) T300(SUV) : 71
2) TWB : 89
3) M300 BEV : 600
4) J300 : 170


2. 추가계획 투자비 : 3,352백만원

1) TWB : 620 (GSUV Blank 금형제작, Blank 가공비)
2) J300 : 969 (Capa Increase, J308 Wagon 개발)
3) 샤시기타 : 1,465(설변&공정개선, Blank'g Line 개선
S4500&D2UX Proto Tool'g)

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-1.투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-시트

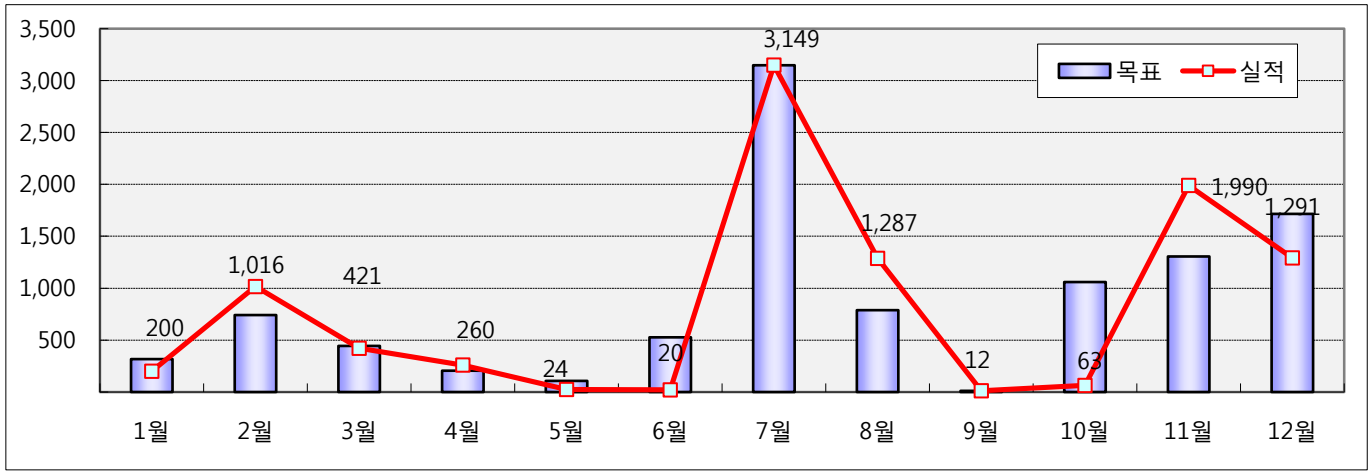

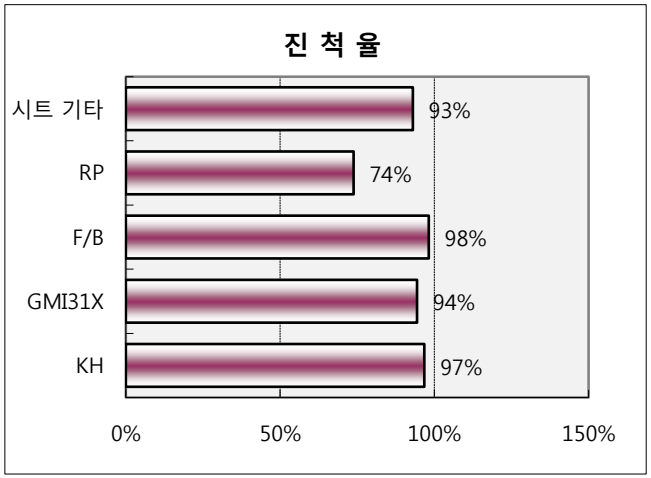

1.프로젝트별 계획/실적 단위:백만원


구분		전년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
KH	목표			282		29		502		787		7	13	533	2,152
	실적			282		29		2		1,287		7	13	463	2,082
GMI31X	목표		27	170		2	62					253			514
	실적		20	447		2	2					15			485
F/B	목표								3,140			756		315	4,211
	실적								3,140				680	315	4,135
RP	목표												838	297	1,135
	실적												838		838
시트 기타	목표	4,387	290	289	444	174	45	25	7	1	11	44	454	571	2,356
	실적	3,943	180	287	421	228	22	19	9		12	42	459	514	2,192
합계	목표	4,387	317	741	444	205	107	527	3,147	788	11	1,059	1,305	1,716	10,368
	실적	3,943	200	1,016	421	260	24	20	3,149	1,287	12	63	1,990	1,291	9,732
	%	90%	63%	137%	95%	127%	23%	4%	100%	163%	105%	6%	152%	75%	94%


특기사항

1. BH FRT TRACK HOLDER PIN 삭제의 건(3.0)
2. KH MONITOR 떨림 개선 금형 개발(391.0)
3. PUMP'G DEVICE 개발 부품비(2.0)
4. PUMP'G 200S PROTO 지그 제작(3.0)

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-2.해외법인 先투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-Pos-austem

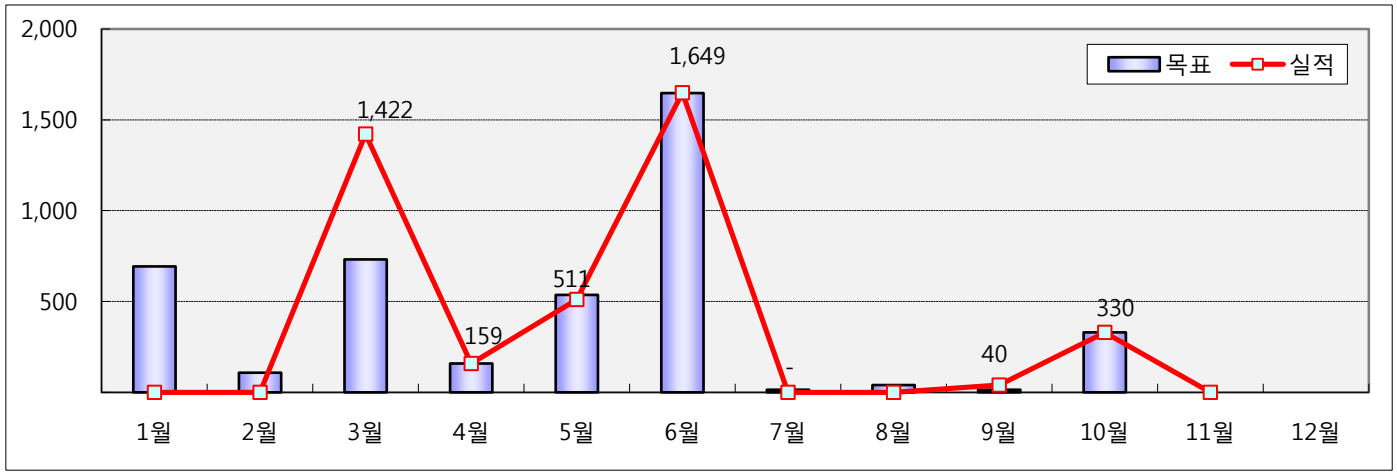

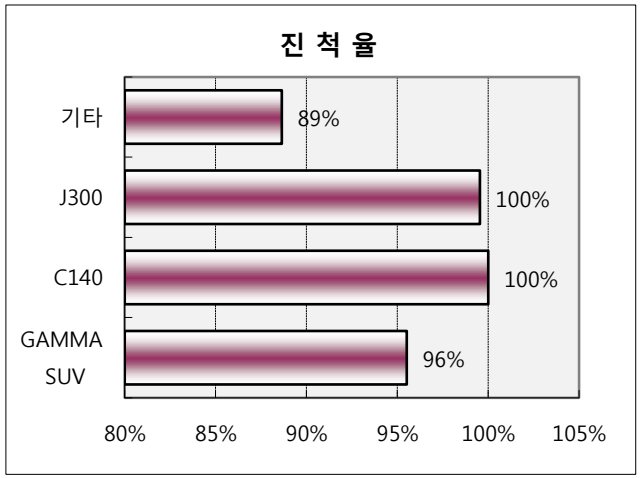

1.프로젝트별 계획/실적 단위:백만원


구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	회수
GAMMA SUV	목표	693	24	712		529	74							2,032	2,329
	실적			1,402		478	61							1,941	
C140	목표				9									9	3,361
	실적				9									9	3,361
J300	목표		20			7	1,573	14	40	14				1,669	1,738
	실적					33	1,588			40				1,661	1,335
기타	목표		64	20	150						330			564	2,939
	실적			20	150						330			500	2,588
합계	목표	693	108	732	159	536	1,647	14	40	14	330			4,273	10,367
	실적			1,422	159	511	1,649	-		40	330			4,110	7,284
	%	0%	0%	194%	100%	95%	100%	0%		278%	100%			96%	70%


특기사항(미집행투자비)

1. 미집행투자비:없음.

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-2.해외법인 先투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-O'zauto austem

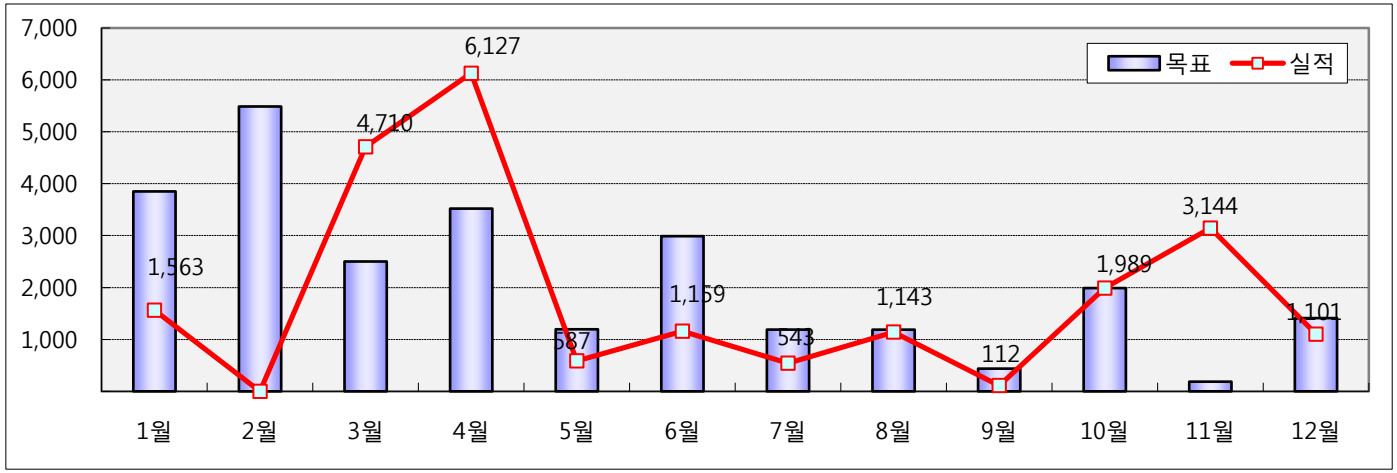

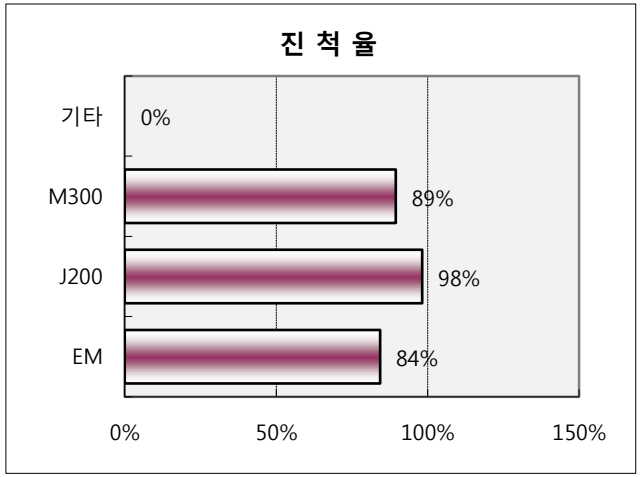

1.프로젝트별 계획/실적 단위:백만원

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	회수
EM	목표	3,851	4,481	2,501	3,520	1,195	2,985	1,189	1,188	437	405	174	1,403	23,329	22,717
	실적	1,563		4,710	6,127	587	1,159	543	240	112	432	3,105	1,093	19,670	1,956
J200	목표		322				4				1,584	13	8	1,931	2,762
	실적								291		1,557	40	8	1,896	334
M300	목표		684											684	817
	실적								612					612	
기타	목표														
	실적														
합계	목표	3,851	5,487	2,501	3,520	1,195	2,989	1,189	1,188	437	1,989	186	1,411	25,944	26,296
	실적	1,563		4,710	6,127	587	1,159	543	1,143	112	1,989	3,144	1,101	22,178	2,290
	%	41%	0%	188%	174%	49%	39%	46%	96%	26%	100%	1690%	78%	85%	9%

특기사항

1. 2012년 이월 투자비 : 602백만원

1) Gamma EM : 496
2) UZAUTO-J200 : 35
3) UZAUTO-M300 : 72

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-3. 신규 Project 진행 현황-샤시

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

Rev.	Date	Change	Remarks
21	2-Mar-11	M300 BEV Timing update	
22	27-Apr-11	GSV EM Uz Front LCA 추가	

Division	Program			Timing	Award (P.O)	–	–	T.K.O	–			–		–	1st Parts	PPV		–	MVBns	–	–	MVBs	–	S.O.R.P	REMARK
	Program	Part Name	Customer	Austem	–	D.V Test	V.T.C	–	T.K.O	Raw Materai	C/F	Tool Off	Shipping	Install	–	–	P.V Test	V.T.C	–	PPAP Submit	PPAP App.	–	R @ R	–	
Chassis	C14X China	FRT/REAR/ARM	SGM	China	10-7-26	N/A	N/A	10-9-13	10-9-13	10-12-30	10-12-30	11-2-28	11-3-13	11-4-30	11-4-30	11-7-5	11-4-1 11-5-1	11-5-30 11-7-30	11-8-9	11-8-30	11-9-19	11-9-26	11-11-1	11-12-12	
	Gamma EM	BAR RAD	GM BRA	Korea	10-10-1	N/A	N/A	10-10-1	10-10-1	10-12-30	11-2-15	11-2-28	N/A	11-3-30	11-4-25	11-8-8	N/A	N/A	11-10-17	12-1-30	12-2-15	12-2-20	12-4-30	12-6-4	
		Front Cradle	GM UZ	Uz	10-10-31	N/A	N/A	11-2-1	11-2-28	11-5-30	11-6-15	11-8-30	11-12-19	11-3-16	N/A	12-3-2	12-2-15	12-5-30	12-6-1	12-6-16	12-7-1	12-7-20	12-8-1	12-10-29	
		Rear Axle	GM UZ	Uz	10-10-31	N/A	N/A	11-2-1	11-2-28	11-5-30	11-6-15	11-8-30	11-12-19	11-3-16	N/A	12-3-2	12-2-15	12-5-30	12-6-1	12-6-16	12-7-1	12-7-20	12-8-1	12-10-29	
		Front LCA	GM UZ	Uz	11-4-2	N/A	N/A	11-4-29	11-5-6	11-6-30	11-8-5	11-8-30	11-12-19	11-3-16	N/A	12-3-2	12-2-15	12-5-30	12-6-1	12-6-16	12-7-1	12-7-20	12-8-1	12-10-29	
		Front Cradle	GM INDONESIA	Korea	10-10-31	N/A	N/A	11-10-1	11-10-1	12-2-1	12-2-1	12-4-1	N/A	12-5-1	12-6-1	12-8-24	12-8-24	12-11-9	12-11-9	12-11-9	13-1-18	13-1-18	13-2-28	13-4-28	
		Rear Axle	GM INDONESIA	Korea	10-10-31	N/A	N/A	11-10-1	11-10-1	12-2-1	12-2-1	12-4-1	N/A	12-5-1	12-6-1	12-8-24	12-8-24	12-11-9	12-11-9	12-11-9	13-1-18	13-1-18	13-2-28	13-4-28	
	GAMMA SUV	FRT Cradle	GM KOREA	Korea	08-4-1	10-6-1	10-12-30	11-1-20	11-2-15	11-6-6	11-6-6	11-8-15	N/A	11-9-1	N/A	11-11-11	11-10-1	12-1-30	12-1-27	12-1-31	12-2-6	12-3-16	12-4-6	12-6-25	
		FRT Cradle	SGM	China	08-4-1	10-6-1	10-12-30	11-1-20	11-4-1	11-6-30	11-6-30	11-8-15	N/A	11-10-30	11-11-11	12-4-16	11-4-1	12-7-2	12-7-2	11-8-15	11-8-20	12-9-10	11-10-1	12-11-26	
		REAR RDM	GM KOREA SGM	China	08-4-1	10-6-1	10-11-30	11-3-21	11-4-1	11-6-30	11-6-30	11-8-15	N/A	11-9-15	11-10-24	11-11-11	N/A	N/A	12-1-27	12-1-31	12-2-6	12-3-16	12-4-6	12-6-25	
		FRT LCA	GM KOREA SGM	China	08-4-1	10-6-1	10-11-30	11-1-20	11-2-15	11-6-30	11-6-30	11-8-15	N/A	11-9-15	11-10-14	11-11-11	11-10-1	12-1-30	12-1-27	12-1-31	12-2-6	12-3-16	12-4-6	12-6-25	
		Side Rail Rear	GM KOREA	Korea	T.B.D	N/A	N/A	10-10-1	10-10-1	10-1-30	11-2-15	11-5-30	N/A	11-5-30	11-6-20	11-9-26	N/A	N/A	11-12-30	12-2-6	12-2-16	12-3-9	12-4-6	12-6-25	
	TWB	TWB	GM KOREA	Korea	T.B.D	N/A	N/A	N/A	11-2-15	11-2-28	N/A	11-4-30	N/A	11-8-15	N/A	11-9-5	N/A	N/A	12-1-6	12-1-31	12-2-6	12-2-24	12-3-15	12-6-4	austem 11-7-10
	M300 BEV	UCCB	GM KOREA	Korea	10-10-31	11-7-26	11-10-1	11-11-1	11-11-1	-	-	12-4-30	N/A	12-4-30	12-7-15	12-8-3	12-7-30	12-11-15	12-10-19	12-11-30	12-12-15	12-12-28	12-1-15	13-3-18	P2 drawing will be released 10th of Mar.
		Rear Axle	GM KOREA	Korea	11-1-14	11-8-25	11-10-17	11-7-14	11-7-14	-	-	-	N/A	-	-	12-6-14	12-7-22	12-11-18	12-10-11	12-11-27	12-12-3	12-12-22	-	13-3-4	
	Delta_II (RR520)	Torsion Profile	SGM	China	11-1-30	N/A	N/A	N/A	11-2-15	11-2-28	N/A	11-9-26	11-10-6	11-11-22	11-12-7	N/A		11-11-5	N/A	11-12-1	11-12-10	N/A	N/A	**11-12-15**	
	J308	Rear Axle	GM KOREA	Korea	T.B.D	T.B.D	T.B.D	T.B.D	T.B.D	T.B.D	T.B.D	T.B.D	T.B.D	T.B.D	11-11-1	11-11-8	11-10-1	12-1-16	12-1-31	12-2-16	12-2-29	12-3-20	12-3-9	12-5-29	RR520/90° RR580/90°
	J200	Front C/mbr	GM UZ	Uz	11-3-30	N/A	N/A	N/A	11-10-1	N/A	11-12-15	12-1-20	12-2-1	12-4-30	12-5-1	N/A	12-5-11	12-7-23	N/A	12-8-10	N/A	N/A	12-8-10	N/A	
		Rear C/mbr	GM UZ	Uz	11-3-30	N/A	N/A	N/A	11-10-1	N/A	11-12-15	12-1-20	12-2-1	12-4-30	12-5-1	N/A	12-5-11	12-7-23	N/A	12-8-10	N/A	N/A	12-8-10	N/A	

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-3. 신규 Project 진행 현황-샤시

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

Rev.	Date	Change	Remarks
21	2-Mar-11	M300 BEV Timing update	
22	27-Apr-11	GSV EM Uz Front LCA 추가	

Division	Program			Timing	Award (P.O)	–	–	T.K.O	–			–		–	1st Parts	PPV		–	MVBns	–	–	MVBs	–	S.O.R.P	REMARK
	Program	Part Name	Customer	Austem	–	D.V Test	V.T.C	–	T.K.O	Raw Materai l	C/F	Tool Off	Shippin g	Install	–	–	P.V Test	V.T.C	–	PPAP Submit	PPAP App.	–	R @ R	–	
Wheel	Gamma EM	Steel Wheel -A	GM UZ	UZ	11-2-11	N/A	N/A	11-2-1	11-3-10	11-3-15	N/A	11-8-30	11-11-1	12-1-15	N/A	12-3-2	12-2-15	N/A	12-6-1	12-6-16	12-7-1	12-7-20	12-8-1	12-10-29	
	Gamma SUV	Steel Wheel -A	GM KOREA	Korea	10-5-1	10-10-30	N/A	10-1-29	10-1-29	10-4-30	N/A	10-7-30	N/A	N/A	10-3-30	11-11-11	11-11-15	N/A	12-1-27	12-1-20	12-2-6	12-3-16	12-3-20	12-6-25	

3. 투자비 및 신규 Porject 진행 현황

3-3. 신규 Project 진행 현황-시트

Rev.	DATE	Remark
Rev. 00	2010.06.03	

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


Division	Program	Item	Region	Customer	Award	Proto	—		T.K.O	—			—	—	M0	PPV (M1)		—	S.P.R	—	MVBns (yy/mh/d	—	MVBs		S.O.R.P	REMARK
				Austem	—		D.V Test	V.T.C	—	T.K.O	Raw Material	C/F	Tool Off	Install		—	P.V Test	V.T.C	—	PPAP Submit	—	PPAP Approval	—	R @ R	—	
SEAT	GMI 31UX	LATCH & HS REC	호주	Futuris	10-1-30	10-7-12	10-9-10	N/A	N/A	11-1-5	11-3-10	11-3-10	11-3-20	11-3-25			11-4-30	N/A		12-2-10	N/A	12-3-5		12-3-15	12-6-15	품질 육성중
	KH	HEIGHT TRACK FRONT//REAR	KOREA	DYMOS	10-10-30	10-12-2	11-1-20			11-7-30			11-9-30	11-10-30			11-12-30	N/A		12-1-3		12-1-10		12-1-25	12-3-10	P2대응중
	B515	RECLINER	CHINA	GILL	11-12-16					11-12-30		12-2-20	12-3-30	12-4-15			12-4-20			12-4-30		12-5-30		12-0630		품의보고
	R_P	2ND TRACK 2ND REC 3RD REC	KOREA	DAYOU		11-6-1 미진행	11-6-30 미진행			11-8-15			12-1-30	12-2-20			12-8-20	12-10-15		12-10-30		12-11-30		12-12-20	13-1-1	시험용 SAMPLE 공급
	VI 개조차	FRT RH TRACK (PROTO)	KOREA	DYMOS		11-12-23	11-1-30			12-2-10			12-6-10	12-7-10			12-8-20	12-9-5		12-10-20		12-11-5			12-11-22	품의 발주
	D2ux	Rear Back Structure	N/A	GME		11-12-30																				최종견적제출 (11/28)


Glossary

T.K.O : Tooling Kick-Off
P.P.V : Production Part Validation
V.T.C : Validation Test Complete
MVBns : Manufacturing Validation Build Non-Salable
MVBs : Manufacturing Validation Build Salable

4. TCR2011 원가절감 현황

단위:백만원

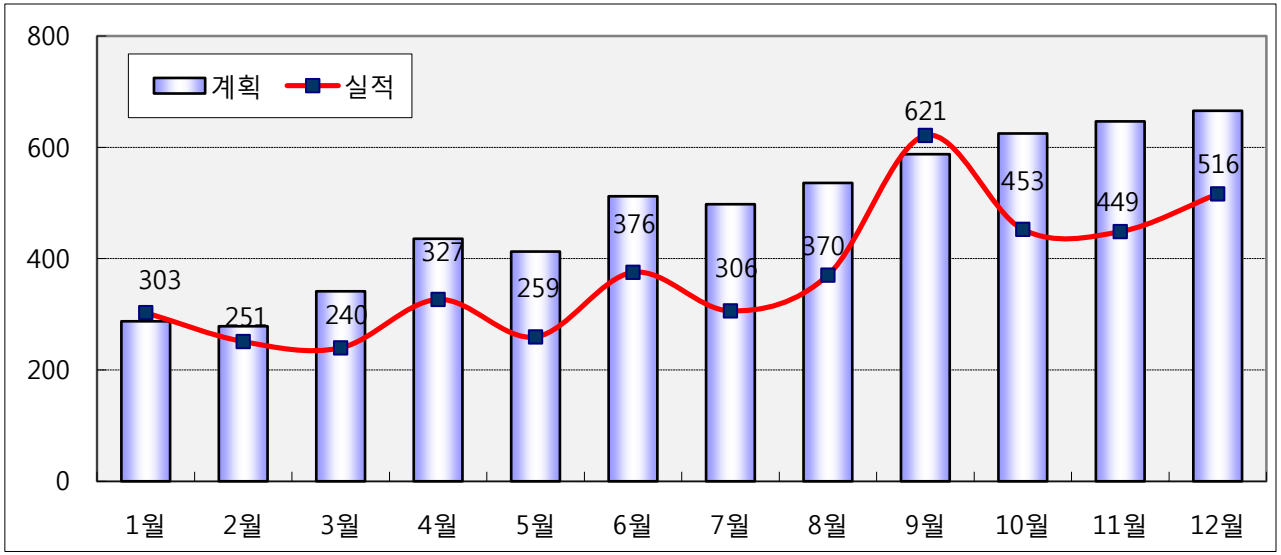


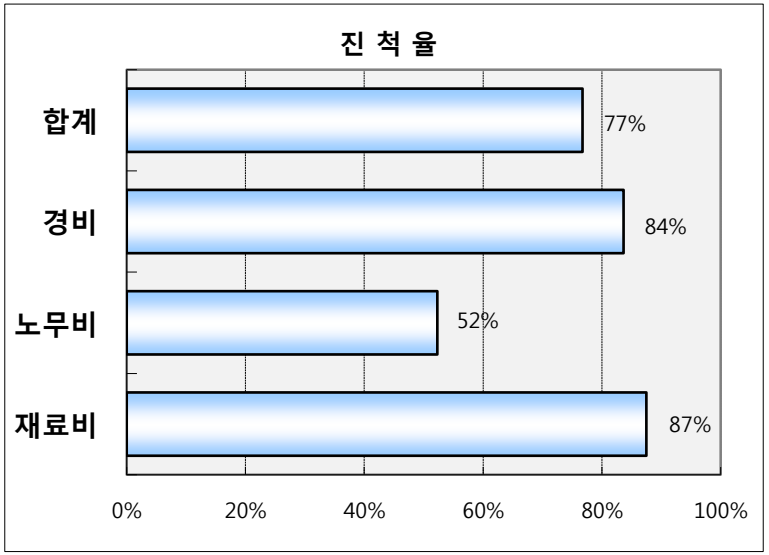


구분		전년실적	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계	합계
재료비	계획	2,500	140	133	159	212	198	210	244	269	301	333	350	349	2,897	2,897
	실적	2,174	142	124	130	159	140	164	164	188	419	259	283	361	2,534	2,534
	%	87%	101%	93%	82%	75%	71%	78%	67%	70%	140%	78%	81%	104%	87%	87%
노무비	계획	1,500	71	70	100	121	114	130	150	157	169	180	186	192	1,639	1,639
	실적	1,053	80	87	74	73	62	76	71	67	80	74	55	58	857	857
	%	70%	113%	124%	74%	61%	54%	59%	47%	43%	48%	41%	30%	30%	52%	52%
경비	계획	2,000	77	75	83	103	101	172	104	110	118	111	112	126	1,291	1,291
	실적	1,004	81	40	35	94	57	135	72	115	122	119	111	98	1,080	1,080
	%	50%	106%	54%	43%	91%	57%	79%	69%	104%	103%	107%	99%	78%	84%	84%
합계	**계획**	**6,000**	**287**	**279**	**341**	**436**	**413**	**512**	**498**	**536**	**588**	**625**	**647**	**666**	**5,827**	**5,827**
	실적	**4,231**	**303**	**251**	**240**	**327**	**259**	**376**	**306**	**370**	**621**	**453**	**449**	**516**	**4,472**	**4,472**
	%	**71%**	**105%**	**90%**	**70%**	**75%**	**63%**	**73%**	**62%**	**69%**	**106%**	**72%**	**69%**	**78%**	**77%**	**77%**

특기사항

5. 2011년 고객사 차량할당 실적 현황

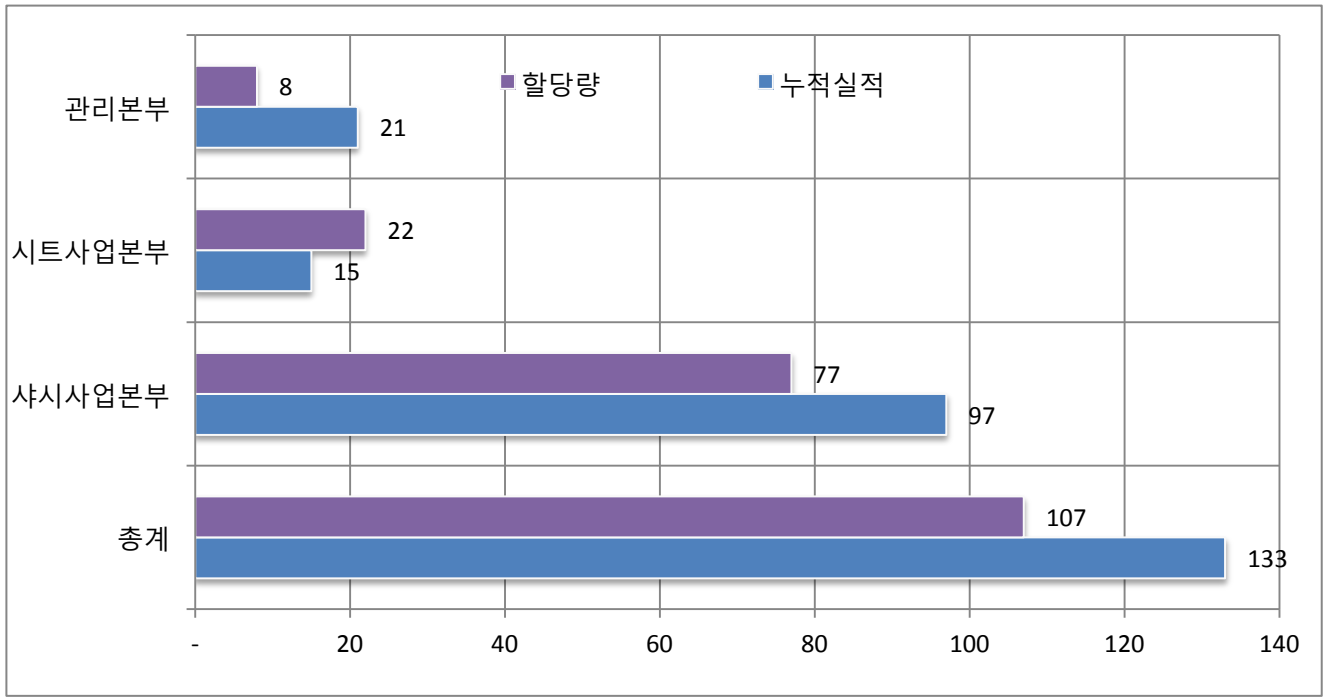

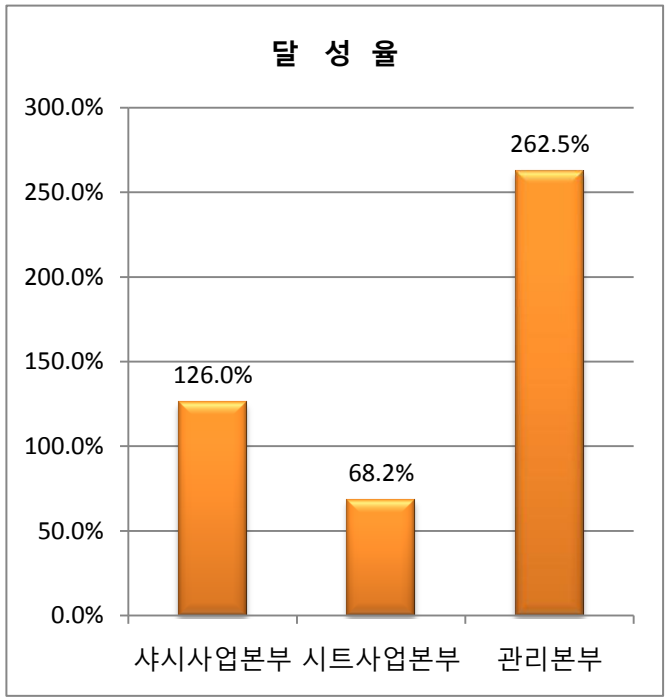

구분	전년 실적	할당량	2011년 월별 차량 판매 현황												누계		비고
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	실적	달성율	
총계	**80**	**107**	**8**	**3**	**2**	**7**	**13**	**11**	**10**	**19**	**20**	**17**	**17**	**6**	**133**	**124.3%**	법인차량 포함
샤시사업본부	38	77	4	3	1	6	8	9	7	15	16	12	13	3	97	126.0%	
시트사업본부	16	22	1	-	1	-	2	1	-	1	3	3	1	2	15	68.2%	
관리본부	26	8	3	-	-	1	3	1	3	3	1	2	3	1	21	262.5%	

주) 1) 고객사 2011년 차량 할당량 107대 기준

2) 차량판매 조기달성으로 차량판매 특별지원책을 12월 중지, 2012년 1월, 2월 대체 운영

6. 사업본부별 업무동향

부서	주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
샤시사업본부	1.군산KD 업체 포장반납 일정 협의中(반납예정일:3월 20일) 2.연말 재고실사 완료 (12월 31일) 3.V250 생산 종료 (1월 31일) 4.우즈벡 사업 관련 업무 진행 -오스템 우즈벡 법인 CKD 공급 업무(GSV EM - 850 대분) -Lemex 우즈벡 CKD 공급 업무(J200 - 4,300 대분) 5. E2xx Project 대응 -Front/Rear Cradle, FLCA, Links류 TR 및 견적 대응 .1/16~1/24 북미에서 TR 실시예정 .견적 Due Date : 1/15	(←) 1. 군산 → 인천 KD 이관 아이템에 대한 협의 진행 中 (←) 2. 재고실사 원인 분석 및 회계 감사 대응 (1월 6일) (←) 3. 재고 및 생산수량 조정 (←) 4. Item 별 포장 사양 Define 및 업체 포장 실시 (1월 31일) - COSMA와 제휴하여 대응 - Front Cradle과 FLCA는 Austem 에서도 공동 설계 진행 중 - 북미 F2F meeting을 통해 최종 설계 사양 결정 및 TR 참석 예정 (연구소 박상진 대리, 사업개발 김화진 상무, 허영호 과장)	
시트사업본부	1.JCDS 방문 및 대표이사 MEETING 2.B515 양산 TOOL 및 M&E 개발 3.SHUTTLE PRESS LAY-OUT 변경(금형적치대 개선) 4.CTS(GM CORE 검증시험)-1/30 5.SQ 용접부문 업체 정리중	- 국산화, CMF1 STRUCTURE 외 - 1/13일 ~ 1/19일 - 시험 JIG 및 프로그램 준비 & 검증 실시ㅁ - 1/31일한 정리	
중국공장	1.TUBE LINE 2SHIFT 생산시작:(12/29~) 2.도장라인 conveyor 2공장 연결공사 진행중(1/4~31) 3.춘절 비상근무 계획수립 (1/21~1/27) 1)고객사 SGM(심양)휴무계획:(1/22~1/26) 2)PRESS #1 Line 정비(1/21~1/25)		
관리본부	1. ISO14001 사후 및 갱신심사 1) 일정 : 2012년 1월 11일 ~ 13일(3일간,6MD) 2) 심사위원 : 장환곤, 강병호 2. 1/4분기 노사협의회(1/17,화) 3.회계감사 1)칸세라: 1월 25일 ~ 27일 2)씨텍,에이씨엠: 1월 30일 ~ 2월 3일 3)오스템 : 2월 13일 ~ 2월 17일		※백두대간 18차 -01월28일(토) 예정 -악휘봉구간(11Km) ※오스템 노동조합 창립일: 1월23일

강평말씀
