대외비(confidential information)

# 경영/품질 회의

(2024년 12월)

2024. 12. 09.

AUSTEM

# 목차

**※ 전월 지시사항**

**1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세**

**2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황**

**3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황**


**4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)**


**※ 강평**

## ※ 전월 지시사항

| 구분 | 지시 및 보완사항 | 추진실적 및 현황 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 업무매뉴얼 | 업무 매뉴얼 작성<br>- 안전을 기본으로하는 작업매뉴얼(현장)<br>: 실천할수 있는 쉬운 매뉴얼<br>- 각 업무 매뉴얼 작성 (내년 상반기까지) | - 현장 작업 표준매뉴얼 작성 중(경영지원&생산본부)<br>(크레인 작업, 작업별 안전장구 착용기준) | |

# 1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

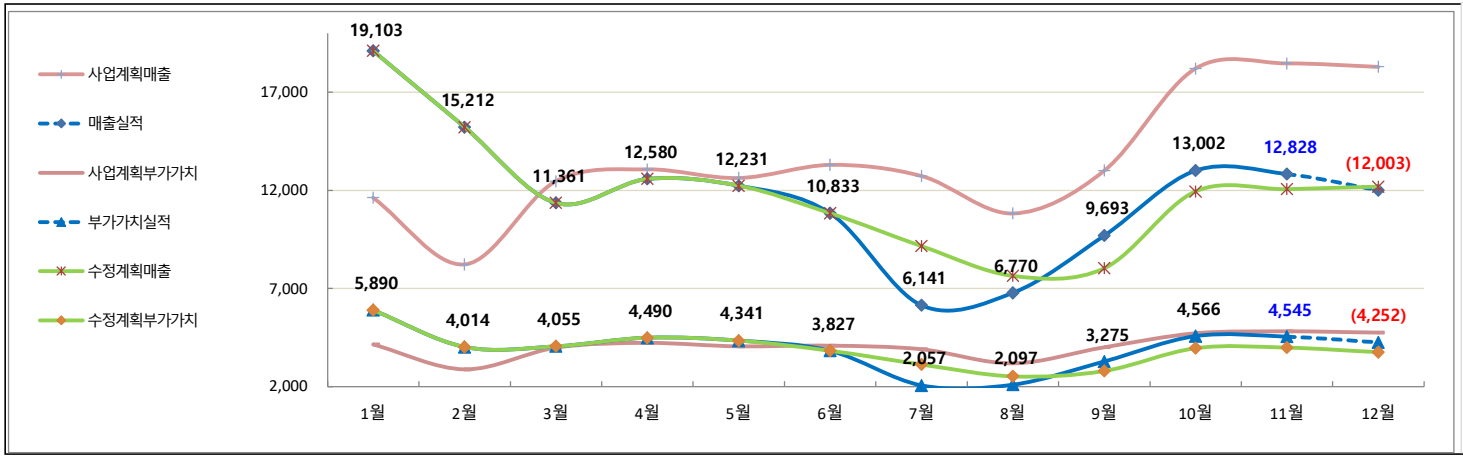

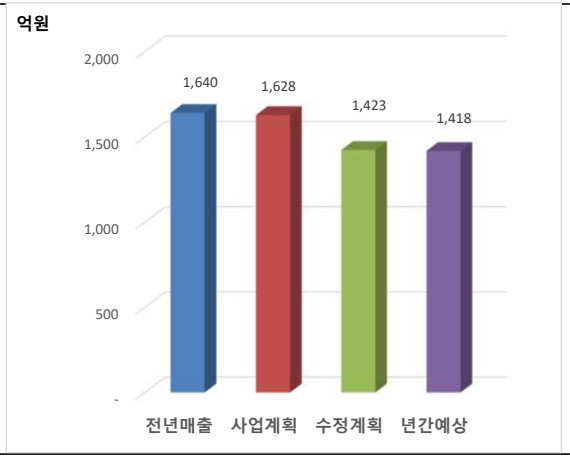
| 구분 | | 2023년 실적 | | 2024년 | | | | | | | | | | | | 누계 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 년간 | 월평균 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | | |
| 매출 (백만원) | 사업계획 | 136,758 | 11,397 | 11,620 | 8,217 | 12,457 | 13,060 | 12,624 | 13,288 | 12,729 | 10,822 | 12,996 | 18,204 | 18,458 | 18,292 | 144,474 | **162,766** |
| | 수정계획 | 152,747 | 12,729 | 19,103 | 15,212 | 11,361 | 12,580 | 12,231 | 10,833 | 9,159 | 7,644 | 8,033 | 11,938 | 12,058 | 12,179 | 130,151 | **142,330** |
| | 실적 | 163,997 | 13,666 | 19,103 | 15,212 | 11,361 | 12,580 | 12,231 | 10,833 | 6,141 | 6,770 | 9,693 | 13,002 | 12,828 | (12,003) | 129,755 | **129,755** |
| | % | 120% | 120% | 164% | 185% | 91% | 96% | 97% | 82% | 67% | 89% | 121% | 109% | 106% | (99%) | 100% | **91%** |
| 부가가치 (백만원) | 사업계획 | 41,784 | 3,482 | 4,139 | 2,877 | 3,986 | 4,221 | 4,050 | 4,087 | 3,897 | 3,191 | 4,006 | 4,712 | 4,813 | 4,745 | 43,977 | **48,722** |
| | 수정계획 | 50,692 | 4,224 | 5,890 | 4,014 | 4,055 | 4,490 | 4,341 | 3,827 | 3,123 | 2,521 | 2,796 | 3,959 | 3,985 | 3,751 | 43,000 | **46,751** |
| | 실적 | 53,733 | 4,478 | 5,890 | 4,014 | 4,055 | 4,490 | 4,341 | 3,827 | 2,057 | 2,097 | 3,275 | 4,566 | 4,545 | (4,252) | 43,156 | **43,156** |
| | % | 129% | 129% | 142% | 140% | 102% | 106% | 107% | 94% | 66% | 83% | 117% | 115% | 114% | (113%) | 100% | **92%** |
| 인원 현황 (명) | 사업계획 | 400 | 400 | 389 | 387 | 380 | 380 | 380 | 381 | 381 | 380 | 381 | 379 | 379 | 379 | 382 | **381** |
| | 수정계획 | 383 | 383 | 384 | 380 | 382 | 381 | 380 | 378 | 375 | 377 | 377 | 375 | 375 | 376 | 379 | **378** |
| | 실적 | 385 | 385 | 384 | 380 | 382 | 381 | 380 | 378 | 374 | 375 | 375 | 376 | 376 | (376) | 378 | **378** |
| | % | 96% | 96% | 99% | 98% | 101% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | (99%) | 100% | **100%** |
| 인건비 지표 (실적) | 사업계획 | 25,056 | 2,088 | 2,465 | 2,289 | 2,460 | 2,434 | 2,550 | 2,494 | 2,423 | 2,483 | 2,350 | 2,546 | 2,458 | 2,485 | 26,953 | **29,437** |
| | 수정계획 | 27,805 | 2,317 | 2,688 | 2,175 | 2,463 | 2,392 | 2,518 | 2,370 | 2,103 | 2,128 | 2,207 | 2,541 | 2,484 | 2,439 | 26,068 | **28,507** |
| | 인건비 실적 | 28,113 | 2,343 | 2,688 | 2,175 | 2,463 | 2,392 | 2,518 | 2,370 | 2,079 | 2,005 | 2,275 | 2,697 | 2,568 | (2,573) | 26,229 | **26,229** |
| | % | 112% | 112% | 109% | 95% | 100% | 98% | 99% | 95% | 99% | 94% | 103% | 106% | 103% | (105%) | 101% | **92%** |
| | 인당인건비 | 73.0 | 6.1 | 7.0 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | (6.8) | 69.3 | **69.3** |
| | 인건비율 | 17.1% | 17.1% | 14.1% | 14.3% | 21.7% | 19.0% | 20.6% | 21.9% | 33.9% | 29.6% | 23.5% | 20.7% | 20.0% | (21.4%) | 20.2% | **20.2%** |
| | 노동분배율 | 52.3% | 52.3% | 45.6% | 54.2% | 60.7% | 53.3% | 58.0% | 61.9% | 101.0% | 95.6% | 69.5% | 59.1% | 56.5% | (60.5%) | 60.8% | **60.8%** |
| | 인당초과근로(시간) | 56.0 | 56.0 | 62.4 | 29.4 | 53.5 | 51.3 | 60.0 | 53.0 | 20.5 | 12.9 | 44.0 | 84.1 | 68.0 | (68.0) | 49.0 | **49.0** |

# 1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

## ※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

| 구분 | 고객사 | 차종 | 수량 단위 | 11월 실적 | | | | | | | | 12월 계획 | | | | | | | | 전월대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 생산수량 | | | | 매출액 | | | | 생산수량 | | | | 매출액 | | | | 매출액 | |
| | | | | 수정 사업계획 | 실적 | 증감 | | 수정 사업계획 | 실적 | 증감 | | 수정 사업계획 | 실행계획 | 증감 | | 수정 사업계획 | 실행계획 | 증감 | | 증감 | |
| | | | | | | 수량 | % | | | 금액 | % | | | 수량 | % | | | 금액 | % | 금액 | % |
| **합 계** | | | | **182,494** | **118,771** | **-63,723** | **65%** | **12,058** | **12,828** | **770** | **106%** | **169,831** | **(149,193)** | **-20,638** | **88%** | **12,179** | **(12,003)** | **-177** | **99%** | **-826** | **94%** |
| **자동차** | | | | **115,923** | **104,371** | **-11,552** | **90%** | **11,074** | **12,660** | **1,586** | **114%** | **102,471** | **(136,113)** | **33,642** | **133%** | **10,305** | **(11,901)** | **1,596** | **115%** | **-759** | **94%** |
| | GMK 부평 | 9BUX/9BQB | 대분 | 23,134 | 25,684 | 2,550 | 111% | 4,295 | 4,960 | 666 | 116% | 22,060 | (26,142) | 4,082 | 119% | 4,082 | (4,949) | 867 | 121% | -11 | 100% |
| | GMK 창원 | 9BQC | 대분 | 22,063 | 24,160 | 2,097 | 110% | 4,152 | 4,803 | 651 | 116% | 20,971 | (24,778) | 3,807 | 118% | 3,967 | (4,789) | 821 | 121% | -14 | 100% |
| | RKM | LJL | 대분 | 6,254 | 6,496 | 242 | 104% | 215 | 223 | 8 | 104% | 6,085 | (4,713) | -1,372 | 77% | 209 | (162) | -47 | 77% | -61 | 73% |
| | | AURORA-1 | 대분 | 5,502 | 7,804 | 2,302 | 142% | 510 | 786 | 276 | 154% | 2,601 | (7,590) | 4,989 | 292% | 241 | (771) | 530 | 320% | -15 | 98% |
| | HMC | US4 | 대분 | 120 | 210 | 90 | 175% | 320 | 560 | 240 | 175% | 120 | (150) | 30 | 125% | 320 | (400) | 80 | 125% | -160 | 71% |
| | EXPORT | HDTranslead | EA | 13,600 | - | -13,600 | 0% | 597 | - | -597 | 0% | 13,600 | (0) | -13,600 | 0% | 597 | (0) | -597 | 0% | - | 0% |
| | | GEMINI | 대분 | 2,700 | 2,410 | -290 | 89% | 293 | 293 | -0 | 100% | 2,700 | (0) | -2,700 | 0% | 293 | (0) | -293 | 0% | -293 | 0% |
| | | GSV-EM | 대분 | 10,720 | 30,025 | 19,305 | 280% | 285 | 796 | 511 | 280% | 10,720 | (28,370) | 17,650 | 265% | 285 | (637) | 353 | 224% | -159 | 80% |
| | | SEAT | 대분 | 31,830 | 7,582 | -24,248 | 24% | 296 | 49 | -246 | 17% | 23,614 | (44,370) | 20,756 | 188% | 224 | (130) | -94 | 58% | 80 | 263% |
| | 기타차종 및 A/S | | | | | | | 111 | 189 | 78 | 170% | | | | | 86 | (63) | -23 | 74% | -126 | 33% |
| **SOLAR** | | | | **66,571** | **14,400** | **-52,171** | **22%** | **984** | **168** | **-816** | **17%** | **67,360** | **(13,080)** | **-54,280** | **19%** | **1,874** | **(101)** | **-1,772** | **5%** | **-67** | **60%** |
| | STAMPING | | EA | 62,333 | 14,400 | -47,933 | 23% | 512 | 168 | -343 | 33% | 62,333 | (13,080) | -49,253 | 21% | 512 | (101) | -410 | 20% | -67 | 60% |
| | H-BEAM | | EA | 4,238 | - | -4,238 | 0% | 473 | - | -473 | 0% | 5,027 | (0) | -5,027 | 0% | 1,362 | (0) | -1,362 | 0% | 0 | 0% |

# 1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

| 구분 | | 10월 실적 | 11월 | | | | 12월 | | | | 주요내용 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 수정계획 | 실적 | % | 전월대비 | 수정계획 | 실행계획 | % | 전월대비 | | | |
| 차량생산 | GMK 부평 | 26,505 | 23,134 | 25,684 | 111% | 97% | 22,060 | (26,142) | (119%) | 102% | * 특별 연장근로 시행 중(9/28~12/29) : 토(10T → 11T), 일(10T → 11T) | | 2shift |
| | GMK 창원 | 25,495 | 22,063 | 24,160 | 110% | 95% | 20,971 | (24,778) | (118%) | 103% | * 특별 연장근로 시행 중(10/20~12/29) : 일요일 8T 추가 | | 2shift |
| | KG 모빌리티 | 648 | 980 | 462 | 47% | 71% | 630 | (900) | (143%) | 195% | | | 2shift |
| | RKM | 11,096 | 11,756 | 14,300 | 122% | 129% | 8,686 | (12,303) | (142%) | 86% | * New Project 공사 : 25년 1월 2일 ~ 25년 2월 7일 | | 2shift |
| 매출 | | **13,002** | **12,058** | **12,828** | **106%** | **99%** | **12,179** | **(12,003)** | **(99%)** | **94%** | | | |
| | Wheel | 982 | 847 | 1,113 | 131% | 113% | 823 | (968) | (118%) | 87% | * 11월~12월 : 증가(9BUX, 9BQC) | | |
| | Body | 24 | 891 | 327 | 37% | 1347% | 891 | (0) | (0%) | 0% | * 11월 : 감소(HDTranslead), 12월 : 감소(GEMINI, HDTranslead) | | |
| | Chassis | 7,133 | 5,991 | 7,435 | 124% | 104% | 5,488 | (7,200) | (131%) | 97% | * 11월 : 증가(9BUX, 9BQC, GSV-EM, AURORA-1)<br>* 12월 : 증가(9BUX, 9BQC, GSV-EM, AURORA-1), 감소(LJL) | | |
| | Module | 466 | 418 | 454 | 109% | 98% | 403 | (461) | (114%) | 101% | * 11월~12월 : 증가(9BUX) | | |
| | Seat | 3,551 | 2,927 | 3,331 | 114% | 94% | 2,701 | (3,271) | (121%) | 98% | * 11월~12월 : 증가(9BUX, 9BQC, US4), 감소(수출) | | |
| | Solar | 846 | 984 | 168 | 17% | 20% | 1,874 | (101) | (5%) | 60% | * 11월~12월 : 감소(Stamping, H-Beam) | | |
| 직접인원 | | **208** | **202** | **208** | **103%** | **-** | **204** | **(207)** | **(101%)** | **-1** | **11월** | **12월** | |
| | Wheel | 22 | 18 | 22 | 122% | - | 18 | (22) | (122%) | - | | | |
| | Body | 19 | 20 | 19 | 95% | - | 24 | (19) | (79%) | - | | | |
| | Chassis | 82 | 80 | 82 | 103% | - | 78 | (81) | (104%) | -1 | | * 협력직 감소(-1명) | |
| | Module | 32 | 32 | 32 | 100% | - | 32 | (32) | (100%) | - | | | |
| | Seat | 53 | 52 | 53 | 102% | - | 52 | (53) | (102%) | - | | | |

# ■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

**<매출>**

단위 : 백만원

| 구분 | | 2023년 실적 | | 2024년 | | | | | | | | | | | | 누계 | 비고 (매출환율연동) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 년간 | 월평균 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | | |
| | | | | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 계획 | | |
| 환율 | 사업계획 | 1$=1,200원 | | 1$=1,250원 | | | | | | 1$=1,250원 | | | | | | | |
| | 실적(월평균) | 1$=1,308원 | | 1$=1,328원 | 1$=1,334원 | 1$=1,334원 | 1$=1,372원 | 1$=1,366원 | 1$=1,382원 | 1$=1,383원 | 1$=1,352원 | 1$=1,334원 | 1$=1,368원 | 1$=1,396원 | 1$=1,396원 | | |
| Wheel | | 472 | 39 | 39 | 27 | 32 | 55 | 10 | 8 | 12 | 0 | - | - | 1 | (0) | 183 | E2SC/D2UC |
| Body | | 792 | 66 | 61 | 34 | 38 | 18 | 14 | - | - | 25 | - | - | 32 | (0) | 222 | GEMINI |
| Chassis | | 1,305 | 109 | 17 | 18 | 28 | 26 | 39 | 30 | 46 | 34 | 29 | 45 | 85 | (74) | 397 | GSV-EM |
| Module | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | |
| Seat | | 191 | 16 | 14 | 18 | 10 | 30 | 7 | 19 | 13 | 8 | 1 | 16 | 4 | (7) | 140 | ON/MX/H62X |
| Solar | | 2,039 | 170 | 406 | 420 | 58 | 89 | 114 | 79 | 63 | 107 | 69 | 70 | 19 | (12) | 1,494 | Stamping/H-Beam |
| **합 계** | | **4,801** | **400** | **537** | **518** | **165** | **217** | **184** | **136** | **134** | **174** | **99** | **131** | **140** | **(93)** | **2,435** | |

**<부가가치>**

단위 : 백만원

| 구분 | | 2023년 실적 | | 2024년 | | | | | | | | | | | | 누계 | 비고 (재료비 환율연동) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 년간 | 월평균 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | | |
| | | | | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 실적 | 계획 | | |
| 환율 | 사업계획 | 1$=1,200원 | | 1$=1,250원 | | | | | | 1$=1,250원 | | | | | | | |
| | 실적(월평균) | 1$=1,308원 | | 1$=1,328원 | 1$=1,334원 | 1$=1,334원 | 1$=1,372원 | 1$=1,366원 | 1$=1,382원 | 1$=1,383원 | 1$=1,352원 | 1$=1,334원 | 1$=1,368원 | 1$=1,396원 | 1$=1,396원 | | |
| Wheel | | 472 | 39 | 39 | 27 | 32 | 55 | 10 | 8 | 12 | 0 | - | - | 1 | (0) | 183 | |
| Body | | 792 | 66 | 61 | 34 | 38 | 18 | 14 | - | - | 25 | - | - | 32 | (0) | 222 | |
| Chassis | | 1,295 | 108 | 16 | 18 | 27 | 24 | 38 | 28 | 45 | 33 | 27 | 37 | 74 | (64) | 366 | 9BUX/Aurora Bush |
| Module | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | |
| Seat | | 191 | 16 | 14 | 18 | 10 | 30 | 7 | 19 | 13 | 8 | 1 | 16 | 4 | (7) | 140 | |
| Solar | | 550 | 46 | 148 | 118 | 58 | 52 | 114 | 79 | 63 | 107 | 69 | 69 | 19 | (12) | 896 | H-Beam |
| **합 계** | | **3,301** | **275** | **278** | **215** | **164** | **179** | **183** | **134** | **134** | **173** | **97** | **122** | **129** | **(82)** | **1,807** | |

## 2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

| 항목 | 11월 실행계획 | | 11월 실적 | | 실행계획대비 | | 누적 실적(~11월) | | 12월 실행계획 | | 전월실적 대비 | | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | |
| **매출액** | **12,642** | **100.0** | **12,828** | **100.0** | **186** | **1.5** | **129,755** | **100.0** | **12,002** | **100.0** | **-826** | **-6.4** | |
| 자동차 | 12,391 | 98.0 | 12,660 | 98.7 | 269 | 2.2 | 108,049 | 83.3 | 11,901 | 99.2 | -759 | -6.0 | |
| solar | 251 | 2.0 | 168 | 1.3 | -83 | -33.0 | 21,706 | 16.7 | 101 | 0.8 | -67 | -39.9 | |
| **부가가치** | **4,450** | **35.2** | **4,545** | **35.4** | **95** | **2.1** | **43,156** | **33.3** | **4,251** | **35.4** | **-294** | **-6.5** | |
| 자동차 | 4,422 | 35.0 | 4,528 | 35.3 | 106 | 2.4 | 39,569 | 30.5 | 4,246 | 35.4 | -282 | -6.2 | |
| solar | 29 | 0.2 | 17 | 0.1 | -12 | -40.5 | 3,587 | 2.8 | 5 | 0.0 | -12 | -70.6 | |
| 매출원가 | 11,557 | 91.4 | 11,655 | 90.9 | 98 | 0.8 | 121,346 | 93.5 | 11,182 | 93.2 | -473 | -4.1 | 11월환율효과: 129백만원(부가가치기준) 손익반영 |
| 재료비 | 8,192 | 64.8 | 8,283 | 64.6 | 91 | 1.1 | 86,599 | 66.7 | 7,751 | 64.6 | -532 | -6.4 | 12월환율(예상)효과: 82백만원 손익미반영 |
| 노무비 | 2,125 | 16.8 | 2,131 | 16.6 | 6 | 0.3 | 21,494 | 16.6 | 2,130 | 17.8 | -0 | -0.0 | |
| 정규 | 1,725 | 13.6 | 1,672 | 13.0 | -53 | -3.1 | 17,304 | 13.3 | 1,710 | 14.3 | 38 | 2.3 | |
| 도급 | 400 | 3.2 | 459 | 3.6 | 59 | 14.6 | 4,189 | 3.2 | 420 | 3.5 | -39 | -8.4 | |
| 제조경비 | 1,240 | 9.8 | 1,241 | 9.7 | 1 | 0.1 | 13,254 | 10.2 | 1,301 | 10.8 | 60 | 4.8 | |
| 인건비성 경비 | 280 | 2.2 | 271 | 2.1 | -9 | -3.1 | 2,749 | 2.1 | 280 | 2.3 | 9 | 3.2 | |
| 수선/소모품비 | 300 | 2.4 | 309 | 2.4 | 9 | 2.9 | 3,331 | 2.6 | 300 | 2.5 | -9 | -2.8 | |
| 전력비 | 270 | 2.1 | 264 | 2.1 | -6 | -2.1 | 2,786 | 2.1 | 270 | 2.2 | 6 | 2.2 | |
| 감가상각 | 160 | 1.3 | 160 | 1.2 | 0 | 0.0 | 1,593 | 1.2 | 160 | 1.3 | 0 | 0.0 | |
| 포장비 | 25 | 0.2 | 31 | 0.2 | 6 | 24.0 | 518 | 0.4 | 21 | 0.2 | -10 | -32.3 | |
| 연료비 | 65 | 0.5 | 87 | 0.7 | 22 | 33.6 | 780 | 0.6 | 150 | 1.2 | 63 | 72.7 | 사용량 증가(공장동 난방) 예상 |
| 기타 | 140 | 1.1 | 119 | 0.9 | -21 | -14.9 | 1,496 | 1.2 | 120 | 1.0 | 1 | 0.8 | |
| 고철매각 | 459 | 3.6 | 397 | 3.1 | -62 | -13.4 | 3,950 | 3.0 | 355 | 3.0 | -42 | -10.7 | 고철 단가 하락 추세 |
| 매출총이익 | 1,544 | 12.2 | 1,570 | 12.2 | 26 | 1.7 | 12,359 | 9.5 | 1,174 | 9.8 | -396 | -25.2 | |
| 판매관리비 | 819 | 6.5 | 802 | 6.3 | -17 | -2.1 | 8,999 | 6.9 | 787 | 6.6 | -14 | -1.8 | |
| 인건비 | 443 | 3.5 | 437 | 3.4 | -6 | -1.4 | 4,736 | 3.6 | 442 | 3.7 | 5 | 1.2 | |
| 운반비 | 76 | 0.6 | 81 | 0.6 | 5 | 6.6 | 808 | 0.6 | 45 | 0.4 | -36 | -44.4 | |
| 기타 | 300 | 2.4 | 284 | 2.2 | -16 | -5.4 | 3,455 | 2.7 | 300 | 2.5 | 16 | 5.7 | |
| 영업이익 | 725 | 5.7 | 768 | 6.0 | 43 | 6.0 | 3,360 | 2.6 | 387 | 3.2 | -381 | -49.6 | |

| 고객사 | | 월별 생산수량 | | | 전월대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11월실적 | 12월계획 | 01월계획 | 수량 | % |
| 부평#1 | 9BUX | 18,424 | 18,773 | 11,061 | 349 | 2% |
| | 9BQB | 7,260 | 7,369 | 5,110 | 109 | 2% |
| 창원 | 9BQC | 24,160 | 24,778 | 19,520 | 618 | 3% |
| RKM | LJL | 6,496 | 4,713 | - | -1,783 | -27% |
| | AURORA-1 | 7,804 | 7,590 | - | -214 | -3% |

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

## 3. 신규 Project 진행 현황(2024) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


| Plant | Commodity | Customer | Program | | Miestone / Main Issue | | | | | | | | 고객회수 | | | 투자현황 | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Project | P/Name | T.K.O | 1ST Delivery | Line Install | P.V Start | P.V Completed | PPAP App. | RUN @ Rate | S.O.R.P | 일시불 계획 | 실적 | 회수 시점 | 계획 | 실적 | 진도율 | |
| Cheon-an | Chassis | GM | BEV Prime | RR Links | 26-9-28 수주완료 | 27-8-13 | 28-2-25 | 28-7-28 | 28-11-17 | 29-2-9 | 29-4-6 | 29-6-4 | 895 | | 2027-11 | | | | 일정 변경 (1년 Holding) |
| | | GM | C121 | FCM (Proto) | 24-5-3 | 24-9-12 | 24-7-12 | 24-11-4 | 25-2-21 품질 육성 | 24-9-6 | N/A | N/A | 793 | 793 | 2024-11 | 610 | 550 | 90% | |
| | | | | FCM (Production) | 24-6-24 | 25-4-18 | 25-5-28 Tooling | 25-3-10 | 25-6-27 | 25-9-12 | 25-9-12 | 25-11-10 | 9,531 | | 2025-10 | 8,325 | 8,325 | 100% | |
| | Wheel | 르노코리아자동차 | AR-1 | 18X4B Temp | 24-1-10 | 24-6-12 | 24-5-1 | 24-8-26 | 24-10-11 | 24-10-24 | 24-11-29 | 24-12-6 양산안정화 | 380 | | 2024-12 | 274 | 274 | 100% | 부품가 감가 상각 |
| Plymouth | Solar | FLEXRACK | SFR | Tracker Parts | 23-9-22 | 24-6-10 | 24-5-10 | NA | NA | 24-6-4 | TBD | 24-6-10 양산 안정화 | 421 | | 2024-11 | 2,483 | 2,483 | 100% | 부품가 감가 상각 |

## 3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 실행계획 실적

금액단위:백만원

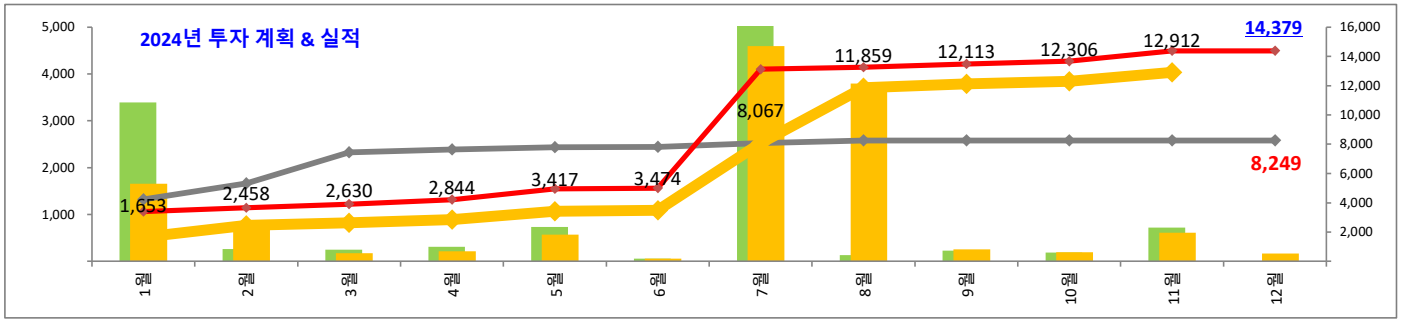

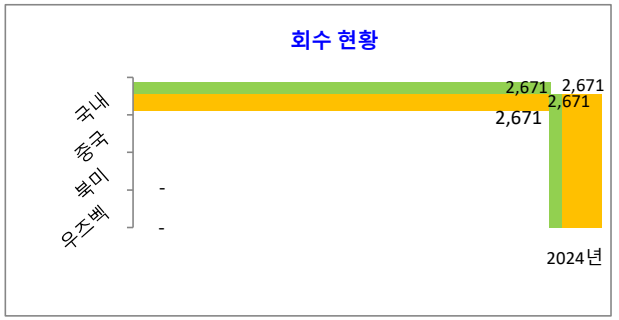
| 구분 | | 2023년 실적 | 2024년 투자 계획/실적 | | | | | | | | | | | | | 계획 증감 | 실행 절감 | 투자 취소 | 잔여 | 회수 | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | | | | | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 합계 | 사업계획 | 5,511 | 4,223 | 1,094 | 2,119 | 200 | 159 | 20 | 260 | 174 | | | | | 8,249 | 10,013 | -1,147 | 3,883 | 154 | 2,036 | 4,996 | | 7,032 |
| | 실행계획 | 9,598 | 3,390 | 263 | 248 | 308 | 736 | 55 | 8,118 | 129 | 222 | 187 | 722 | | 14,379 | | | | | 3,462 | 2,671 | 15,502 | 21,635 |
| | 실적 | 8,598 | 1,653 | 806 | 172 | 214 | 573 | 58 | 4,592 | 3,793 | 254 | 193 | 606 | 167 | 13,079 | | | | | 3,462 | 2,671 | | 6,133 |
| | % | 90% | 49% | 307% | 69% | 69% | 78% | 105% | 57% | 2938% | 114% | 103% | 84% | | 91% | | | | | 100% | 100% | | 28% |
| 국내 | 사업계획 | 5,511 | 2,747 | 1,094 | 2,119 | 200 | 159 | 20 | 260 | 174 | - | - | - | - | 6,773 | 9,876 | -1,147 | 3,883 | 154 | 2,036 | 4,996 | | 7,032 |
| | 실행계획 | 8,737 | 1,914 | 263 | 248 | 308 | 736 | 55 | 8,106 | 129 | 98 | 187 | 722 | - | 12,766 | | | | | 3,462 | 2,671 | 15,502 | 21,635 |
| | 실적 | 7,738 | 177 | 806 | 172 | 214 | 573 | 58 | 4,580 | 3,793 | 129 | 193 | 606 | 167 | 11,465 | | | | | 3,462 | 2,671 | | 6,133 |
| 해외 선투자 | 사업계획 | - | 1,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,476 | 137 | - | - | - | | | | |
| | 실행계획 | 861 | 1,476 | - | - | - | - | - | 12 | - | 125 | - | - | - | 1,613 | | | | | | | | |
| | 실적 | 860 | 1,476 | - | - | - | - | - | 12 | - | 125 | - | - | - | 1,613 | | | | | | | | |

※ 주요 투자 및 회수 현황

**1. 2024년 실행계획 투자비: 14,379백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획:10,013백만원, 투자취소 3,883백만원)**

**2. (11월, 12월) 실적: 773백만원**

: C121, FCM 양산 금형 개발(263백만원), C121 FRT WELDING 양산 라인 개발(170백만원), 신기술 개발을 위한 TEST BED 구축 건(82백만원), AURORA-1 REAR SUB FRAME 양산용 납품 용기 추가제작(56.4백만원), SEAT 레이저 용접 2라인 광화이바 불량 긴급 구매 교체(13.3백만원), 법인 업무용 화물차량 매입(21.6백만원), 9BXX 용접라인 예방 보전을 위한 투자(166.5백만원)

**3. 고객사 회수 계획: 2,671백만원**(A100 9백만원, Aurora-1 1,539백만원, SDIA HEV1 CAN AS 금형개발 330백만원, C121 FCM Proto tool 793백만원), **GSUV EM retooling '25년 투자로 회수시점변경(25년, 3,145백만원→2,385백만원),**

**회수 실적: 2,671백만원 회수 완료**

## 3-2. 투자비 상세 현황

단위:백만원


| 구분 | | | 투자계획 | | | 계획 합계 | 투자 실적 | 집행율 (%) | 미집행 금액 | 절감금액 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 사업계획 | 추가계획 | 투자취소 | | | | | | |
| 국내 | Wheel | AURORA-1 | 300 | 5 | - | **305** | **274** | 100% | - | 31 | 추가:AR1_Wheel, Disc 품질 (Bolt Hole 좌경 증대) 개선 금형 수정(5백만원) |
| | | 기타 | - | 16 | - | **16** | **16** | 100% | - | - | 추가:17인치 STYLED WHEEL 프로모션 샘플 제작 관련 금형수정 및 가공 |
| | Body | BATTERY CAN | 850 | 62 | 480 | **432** | **426** | 100% | - | 6 | 추가: 세정(25), 품질개선(37), 실적: 품질개선 3차 투자(18), 취소: 선행개발(480) |
| | | 기타 | - | 171 | - | **171** | **167** | 98% | 4 | - | STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체 및 AIDA 630TON 수리<br>AI 비전 검사 시스템 도입, 7호기 프레스 수리 |
| | Chassis | C121 | - | 9,223 | 288 | **8,935** | **8,874** | 99% | 60 | 1 | FRT CRADLE PROTO(610), FRT CRADLE 양산(8,325), 취소 : 도장라인개조(288) |
| | | HDTRANSLEAD | 1,805 | -690 | 35 | **1,080** | **60** | 100% | - | 1,020 | 양산라인 투자 취소, 실적 : 설계비(60) |
| | | 9BXX | 420 | 185 | 260 | **345** | **332** | 100% | - | 14 | 9BUX FRT Loading 자동화(165),9BXX 용접라인 예방 보전을 위한 투자건(180)<br>투자취소: 및 9BXX F/LCA(260) |
| | | AURORA-1 | 198 | 17 | - | **215** | **213** | 100% | - | 2 | AURORA 배기시설 설치공사 및 양산용 납품용기 제작, 납품용기추가제작(70백만원) |
| | | GSV EM NB4(UZ) | 1,504 | - | 1,504 | **-** | **-** | 0% | - | - | 우즈벡 GSV_EM 금형신작 투자비 2025년 투자 연기 |
| | | 기타 | 371 | 397 | 221 | **547** | **477** | 100% | - | 70 | Wheel Rim 1Line 철거 및 라인 이설비용 외, 투자 취소 : 221 |
| | Module | 9BUX&9BQB | - | 140 | - | **140** | **140** | 100% | - | - | 9BUX&9BQB FRT CRADLE 하판클립 자동화 설비 구축 |
| | Seat | 9BQX | 604 | 14 | 470 | **148** | **147** | 100% | - | 1 | 9BXX TAPPING LINE 개조(134), 투자취소:TRACK LWR WELD LINE 개조<br>레이저 용접 2라인 광화이바 불량 긴급 구매 교체(14백만원) |
| | 공통 | 건축/구조물 | 538 | 46 | 448 | **136** | **46** | 34% | 90 | - | 공장동 누수 개선, 튜브히터 교체 외 |
| | | 총무비품 | 43 | 262 | 37 | **268** | **265** | 100% | - | 3 | 법인차량 구매 외 |
| | | 전산 H/W, S/W | 140 | 29 | 140 | **29** | **29** | 100% | - | - | 추가 : 전산실 UPS 장비 교체(14.9) |
| 해외 선투자 | 북미 | SFR | 1,476 | 137 | - | **1,613** | **1,613** | 100% | - | - | 북미 태양광 ASSY 설치, 추가/실적: 북미 SFR 태양광 설비 문제점 개선 및<br>SECTOR FULL ASSEMBLY JIG 제작(124.7) |
| 합계 | | | 8,249 | 10,013 | 3,882 | **14,379** | **13,078** | 99% | 154 | 1,147 | |


## 4. 품질 지표 1) 고객 실적


| 구 분 | 단위 | | 23년 실적 | 2024년 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | **11월** | 12월 | 평균& 누계 |
| SPPS (Supplier Practical Problem Solving) | 횟수 | 목표 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| | | CHASSIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** | | 1 |
| | | SEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| | | 인천공장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| LINE STOP | 시간 (분) | 목표 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| | | CHASSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| | | SEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| | | 인천공장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |

## 2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM

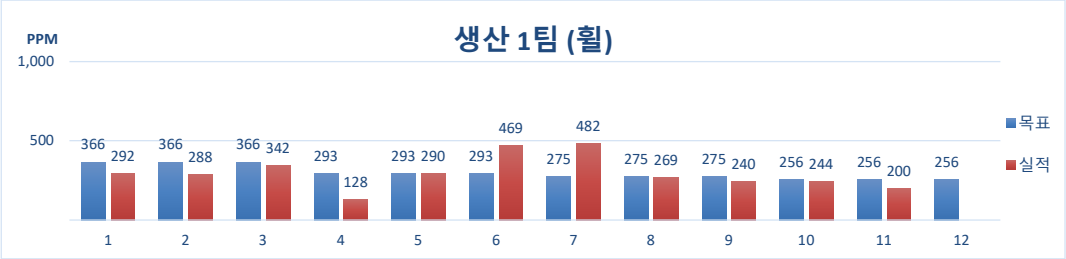

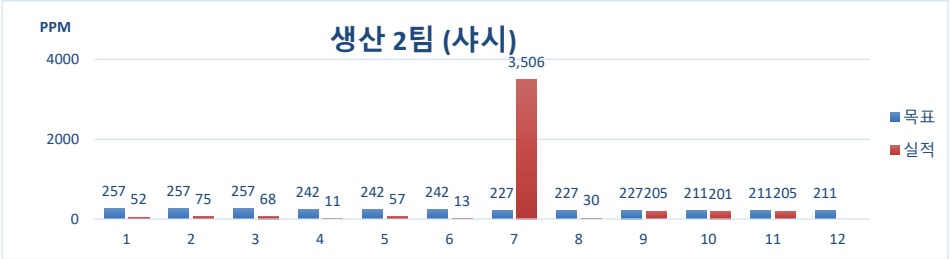





| 구 분 | | 2023년 | 목표 | 2024년 | | | | | | | | | | | | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | **11월** | 12월 | |
| 생산1팀 (휠) | 목표 | 500 | 256 | 366 | 366 | 366 | 293 | 293 | 293 | 275 | 275 | 275 | 256 | **256** | 256 | 301 |
| | 실적 | 430 | | 292 | 288 | 342 | 128 | 290 | 469 | 482 | 269 | 240 | 244 | **200** | | 270 |
| 생산2팀 (샤시) | 목표 | 224 | 211 | 257 | 257 | 257 | 242 | 242 | 242 | 227 | 227 | 227 | 211 | **211** | 211 | 236 |
| | 실적 | 250 | | 52 | 75 | 68 | 11 | 57 | 13 | 3,506 | 30 | 205 | 201 | **205** | | 254 |
| 생산2팀 (시트) | 목표 | 78 | 45 | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 48 | 45 | **45** | 45 | 50 |
| | 실적 | 64 | | 52 | 0.4 | 0.8 | 23 | 7 | 22 | 1 | 9 | 39 | 8 | **0** | | 16 |
| 생산3팀 (인천공장) | 목표 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| | 실적 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | 0 |
| 주요 품질 Issue | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

단위: 천원 ,%

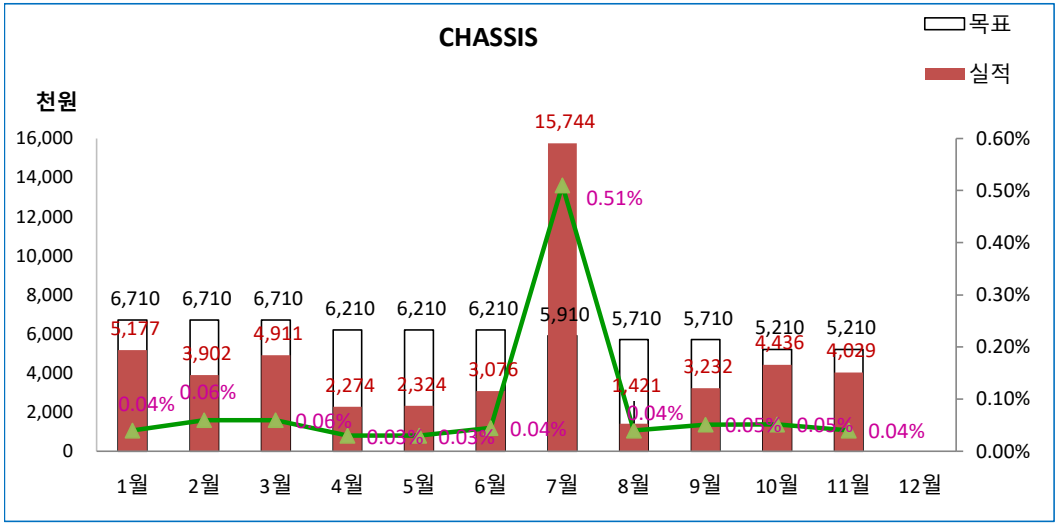

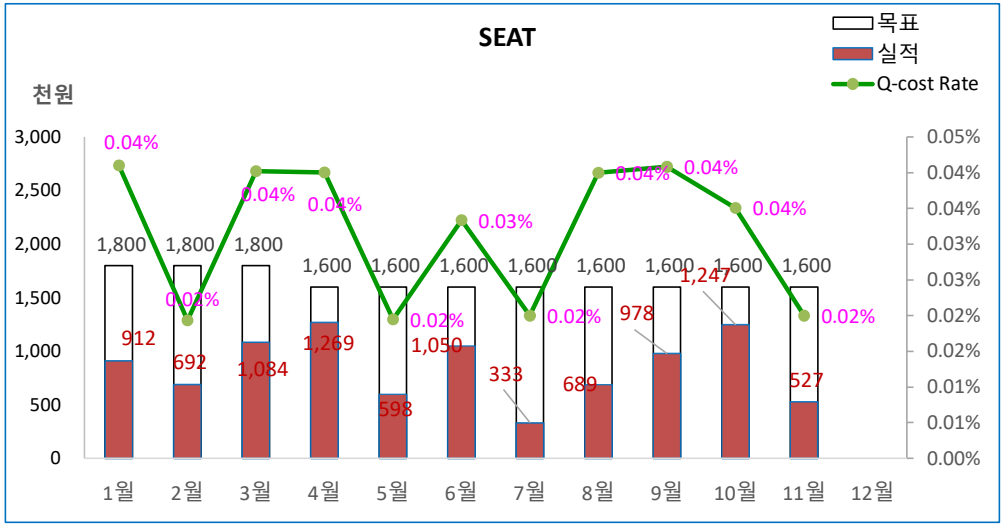
| 구 분 (단위:천원) | | 2023년 | 2024년 | | | | | | | | | | | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| Chassis Q-Cost | 목표 | 81,558 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 5,910 | 5,710 | 5,710 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 66,510 |
| | 실적 | 92,636 | 5,177 | 3,902 | 4,911 | 2,274 | 2,324 | 3,076 | 15,744 | 1,421 | 3,232 | 4,436 | 4,029 | | 50,527 |
| | 실패비용 | 74,419 | 3,206 | 3,129 | 3,613 | 1,239 | 1,706 | 2,517 | 14,969 | 1,024 | 2,762 | 3,506 | 3,579 | | 41,250 |
| | 평가비용 | 14,727 | 1,263 | 773 | 1,298 | 1,035 | 618 | 559 | 775 | 397 | 471 | 736 | 215 | | 8,140 |
| | 예방비용 | 3,373 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 235 | | 1,137 |
| | Q-cost Rate | 0.08% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.51% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | | 0.07% |
| Seat Q-Cost | 목표 | 29,870 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 18,200 |
| | 실적 | 24,537 | 912 | 692 | 1,084 | 1,269 | 598 | 1,050 | 333 | 689 | 978 | 1,247 | 527 | | 9,378 |
| | 실패비용 | 17,695 | 670 | 257 | 493 | 322 | 394 | 801 | 187 | 228 | 595 | 453 | 108 | | 4,509 |
| | 평가비용 | 6,605 | 68 | 435 | 590 | 947 | 204 | 248 | 146 | 461 | 383 | 708 | 419 | | 4,609 |
| | 예방비용 | 180 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | | 260 |
| | Q-cost Rate | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | | 0.03% |
| 주요 품질 Issue | | | | | | | | | | | | | | | |

# 강평 말씀
